

OST
Ostschweizer
Fachhochschule

Projektmanagement (PROM)
LB 2: Grundlagen Projektmanagement

Prof. Dr. Michael Gino Kraft

Michael.kraft@ost.ch

Departement Wirtschaft

Gliederung/Übersicht in Lernblöcken (LB 1 – 7)



LB 1	Einführung
LB 2	Grundlagen Projektmanagement
LB 3	Projektorganisation
LB 4	Projektplanung
LB 5	Teambildung und -entwicklung
LB 6	Projektsteuerung und –kontrolle
LB 7	Gruppenpräsentation

Agenda

1. Projektphasen und Prozessmodelle
2. Projektantrag
3. Projektauftrag und Stakeholderorientierung

Projektmanagement - Exkurs

- **Projektmanagement** bedeutet, ein Projekt zu
- planen
- überwachen
- koordinieren
- steuern


Abgrenzung Projektarbeit und Linienarbeit - Exkurs

Merkmal	Projektarbeit	Linienarbeit
Zielorientierung	Zieldefinition eher als kontinuierlicher Prozess	Eher klar vereinbarte Ziele in definiertem Zeitraum
Zeitliche Begrenzung	Aufgabe endet zu definiertem Zeitpunkt	Kontinuierliche Funktion, die erst endet, wenn Produktwechsel ansteht
Einmaligkeit und Neuigkeit	Jedes Projektprodukt ist ein Unikum	Produkte und DL immer wieder in der gleichen Form und Ausführung
Komplexität	Jeder Arbeitsprozess muss neu erfasst, geplant und gestaltet werden	Ziel: Standardisierung und Vereinfachung, wiederholbare Prozesse
Aufgabenbezogenes Budget	Budget bezieht sich auf Aufgabe	Budget bezieht sich in der Regal auf Funktionsbereich
Rechtlich-organisa-torische Zuordnung	Vorübergehende Organisationsform	Dauerhafte Organisation

Projektphasen

- Ein Projekt gliedert sich in aufeinander folgende, klar definierte und begrenzte Phasen
- Ziele und Aktivitäten jeder Projekt-Phase werden zu Beginn des Projekts genau festgelegt und mit den Phasenergebnissen verglichen
- Anhand dieses Vergleichs wird entschieden (**Meilenstein-Entscheid**), ob
  - die Voraussetzungen für den Start der nächsten Phase geschaffen wurden,
  - bestimmte Aufgaben vorher noch gelöst werden müssen oder
  - ob das Projekt abgebrochen wird.

Typische Projektphasen

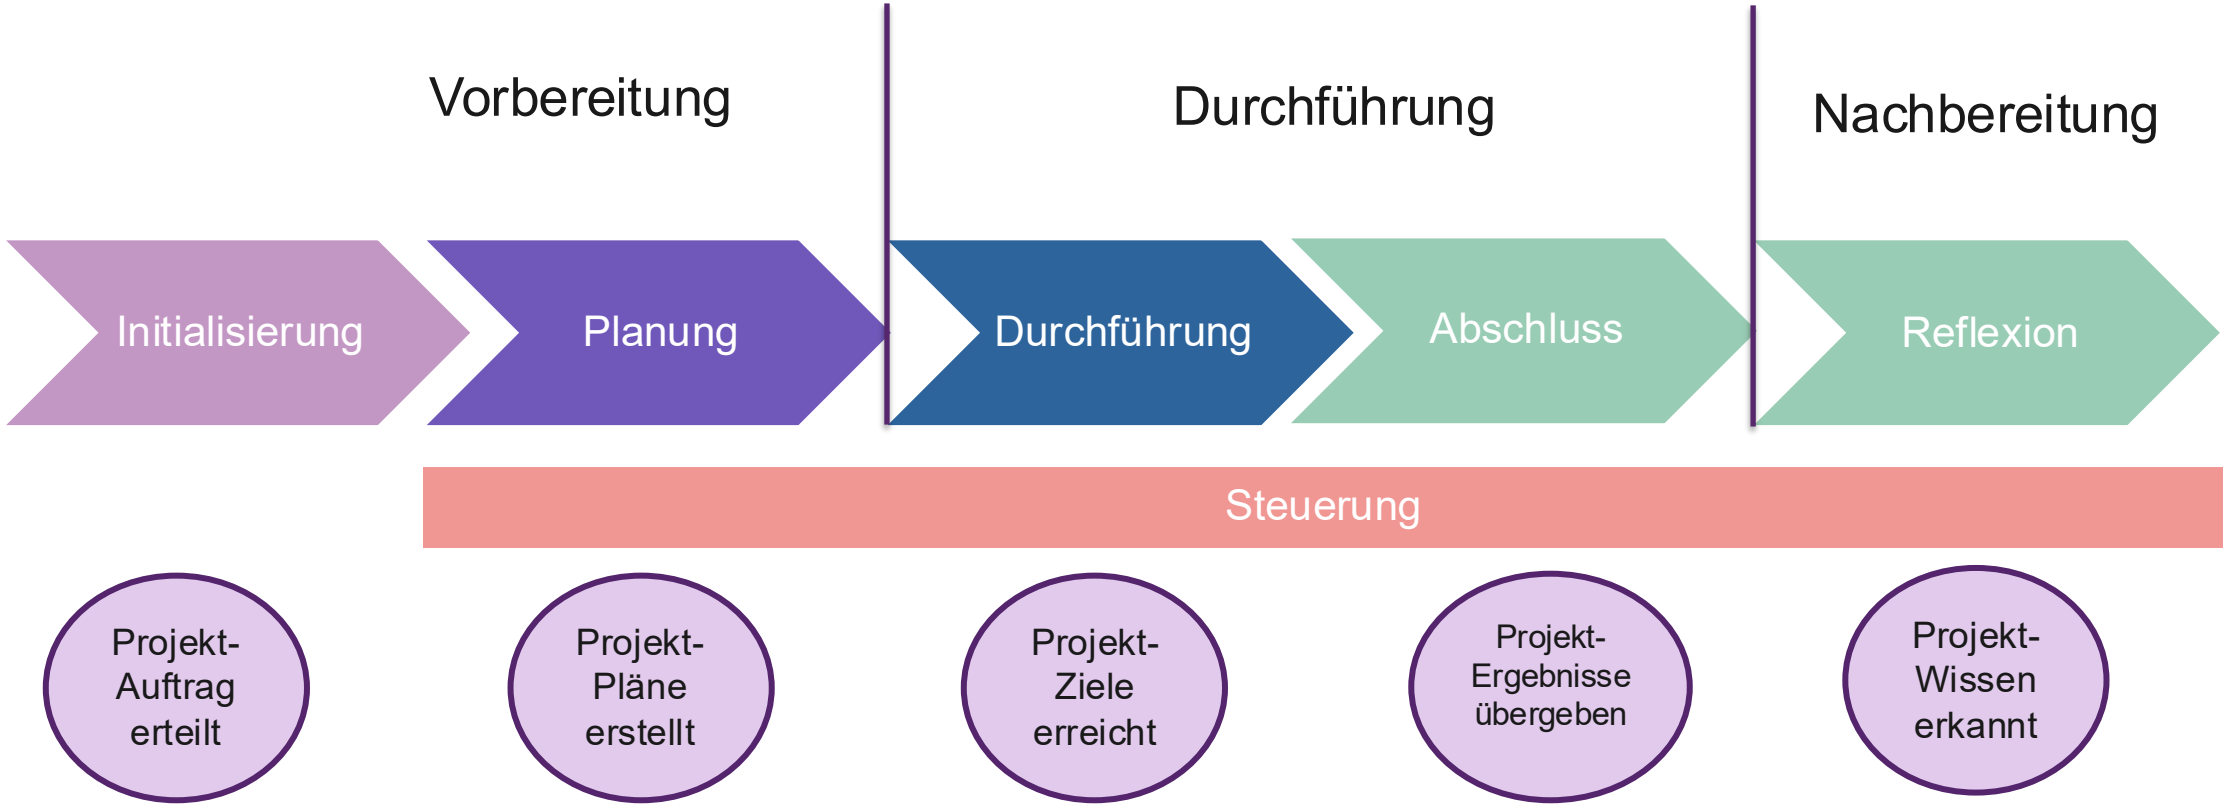


OST

Weitere Projektphase

- Andere Grundstrukturen des Projektmanagements

Hermes:



Jenny:



Schelle:



OST

Kriterien im Projektmanagement

Projekt-Phase / Kriterien	Definition	Planung	Durchführung	Abschluss
Hauptaufgaben/ -aktivitäten	Projekt-Ziele (Ergebnis-, Termin-, Kostenziele) festlegen	Spezifikationen, Termin-, Ressourcen-Pläne erstellen	Steuerung, Kontrolle, Korrekturmassnahmen durchführen	technische und administrative «Aufräumarbeiten»
(eventuelle) Unterphasen	■ Ideenfindung ■ Konzeptfindung ■ Machbarkeitsuntersuchung	■ Grobplanung ■ Feinplanung	■ Entwicklung ■ Fertigung ■ Vertrieb/Betrieb	■ Projekt-Bewertung ■ System-Ausserdienststellung/ Entsorgung
Dokumentation	Projekt-Antrag	Projekt-Auftrag	Projekt-Ergebnisbericht	Projekt-Abschlussbericht
Kostenanteil (in%) *	< 1	< 10	> 80	< 5
Dauer (in Jahren) *	< 1/4	< 1/2	> 1	< 1/4
* typische Werte für Produktentwicklungs- und Raumfahrt-Projekte				

Projektantrag

Der **Projektantrag** enthält folgende Angaben:

- Relevanz, warum es dieses Projekt braucht
- Bedürfnisse, welche es zu erfüllen gilt
- Projekt-Ziele (Ergebnis-, Termin-, Kosten-, Qualitätsziele),
- Projekt-Risiken,
- vorläufige Angaben zur Projekt-Organisation,
- besondere Randbedingungen.

→ dieser **Antrag auf Start des Projekts** und damit auf Freigabe der Projekt-Planungsphase wird der höchsten Entscheidungsinstanz (Kunde, Geschäftsführung, Bereichsleitung usw.) zur Genehmigung vorgelegt

→ Mit einem Projektantrag werden Fördergelder (z.B. beim SNF oder Innosuisse) beantragt um ein Projekt durchführen zu können, meist ein Forschungsprojekt

Bestandteile des Projektantrags

- Ziele als Frage formulieren
- Antrag als Entscheidungsgrundlage
- Beteiligten Personen mit ihrer Rolle (z.B. ProjektleiterIn, Auftraggeber, etc.)
- Mögliche Risiken auflisten

Projektantrag	
0	**Allgemeines**
1	**Zweck des Dokuments**
2	**Management-Übersicht** Kurze und prägnante Zusammenfassung der nachfolgenden Kapitel. Sie sollte max. 2 Seiten umfassen und vorzugsweise eine andere Papierfarbe haben.
3	**Ausgangslage** – Problemstellung – Anlass und Begründung des Projekts – Projektrahmenbedingungen – Situationsanalyse – erbrachte Vorleistungen
4	**Ziele und Lösungen** – Zielvorstellungen (kurz- und langfristig) – mögliche Lösungen
5	**Mittelbedarf** Schätzung über den Bedarf an: – Bewertung der Sicherheits- und Datenschutzaspekte – Sachmittel – Personal – Ausbildung – Dienstleistungen
6	**Planung und Organisation** – Projektorganisation – Termine – Prioritäten
7	**Wirtschaftlichkeit** Grobe Schätzung der Kosten und des Nutzens.
8	**Konsequenzen** – Auswirkungen (organisatorisch, personell, baulich; auf Rahmenbedingungen wie Standards, Vorschriften/Weisungen, usw.) – bei Nichtrealisierung – bei verspäteter Realisierung (gegenüber Plantermin) – auf Schnittstellen zu anderen Systemen – Qualitätsverbesserungen – Risikobeurteilung – Ausweichmöglichkeiten
9	**Antrag** – bisherige Entscheide – Formulierung des Projektantrags
10	**Anhang** – ergänzende Unterlagen – Stellungnahmen – Protokolle

Inhalte des Projektantrags

Der Projektauftrag stellt die wesentliche Bestimmungsgrösse für den weiteren Projektverlauf dar.

Inhalte der Auftragsklärung sind:

Problem genau abzugrenzen	Ziele des Auftraggebers festlegen	Überblick über die Probleme	Inhaltliche Ziele klären	Potenzielle Konflikte identifizieren	Organisatorische Fragen klären	Rollen klären

Ergebnisse des Projektantrags




OST


Projekthemen finden

Identity	Was ist das Problem?
Location	Wo ist das Problem?
Timing	Wann tritt das Problem auf? Wann hat es angefangen? Wie lange bleibt es wahrscheinlich bestehen, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden?
Magnitude	Wie groß ist das Problem (messbar)?

Hypothesenbaum zur Projektinitialisierung

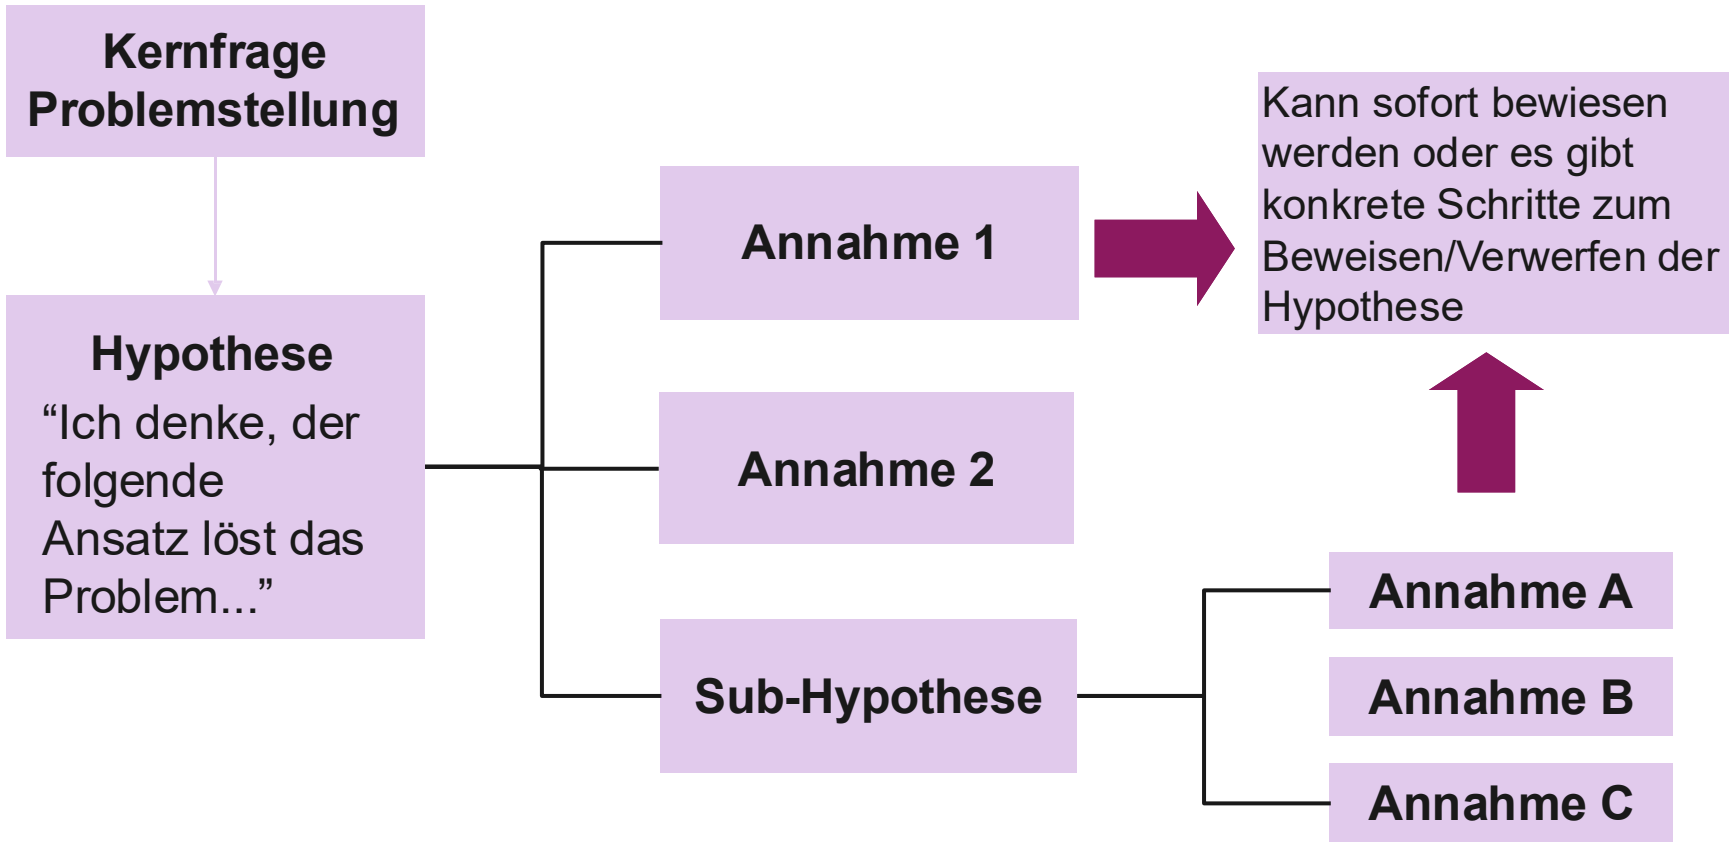


Hypothesenbaum am Fallbeispiel Rektrutierung

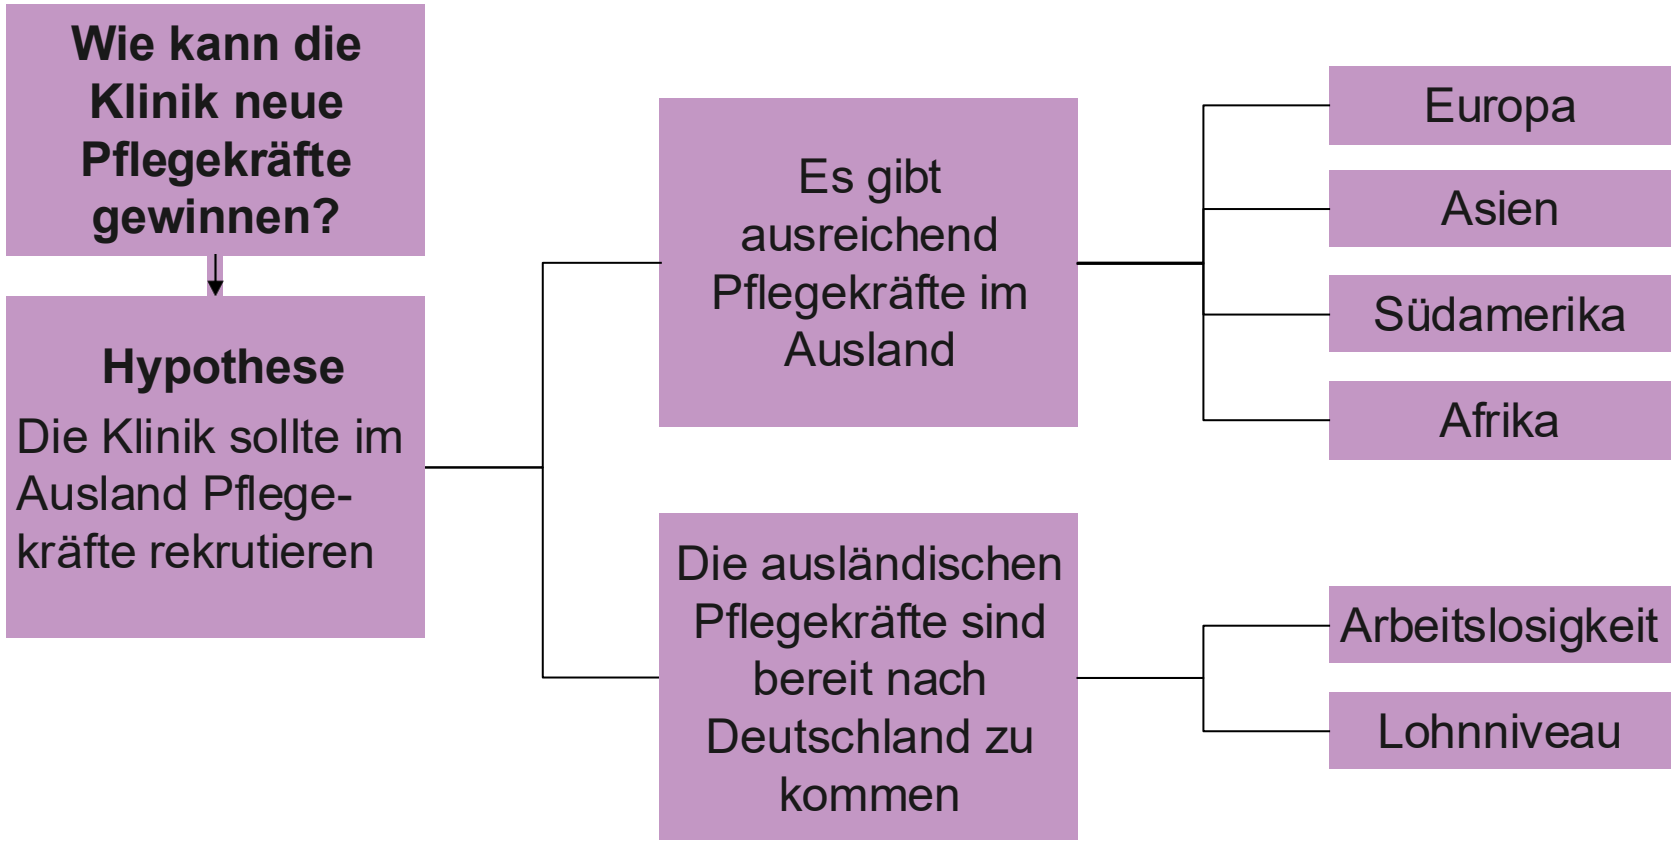


OST

Diagnosebaum zur Ideenfindung

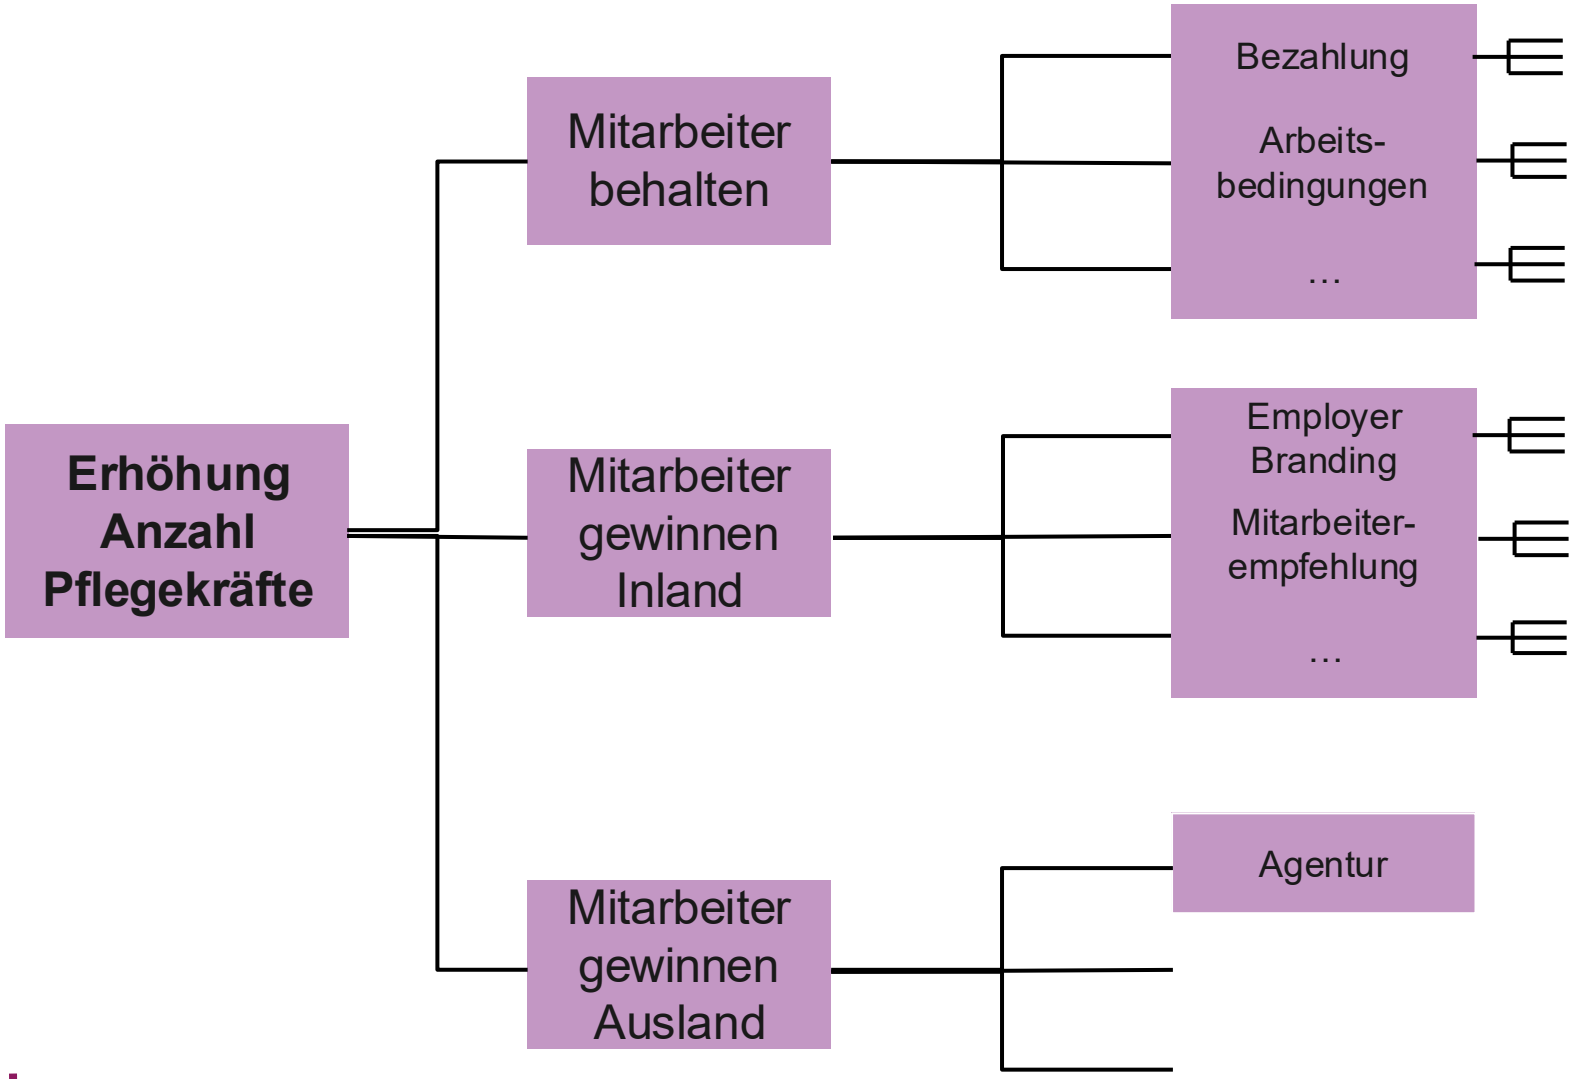

Mind Mapping

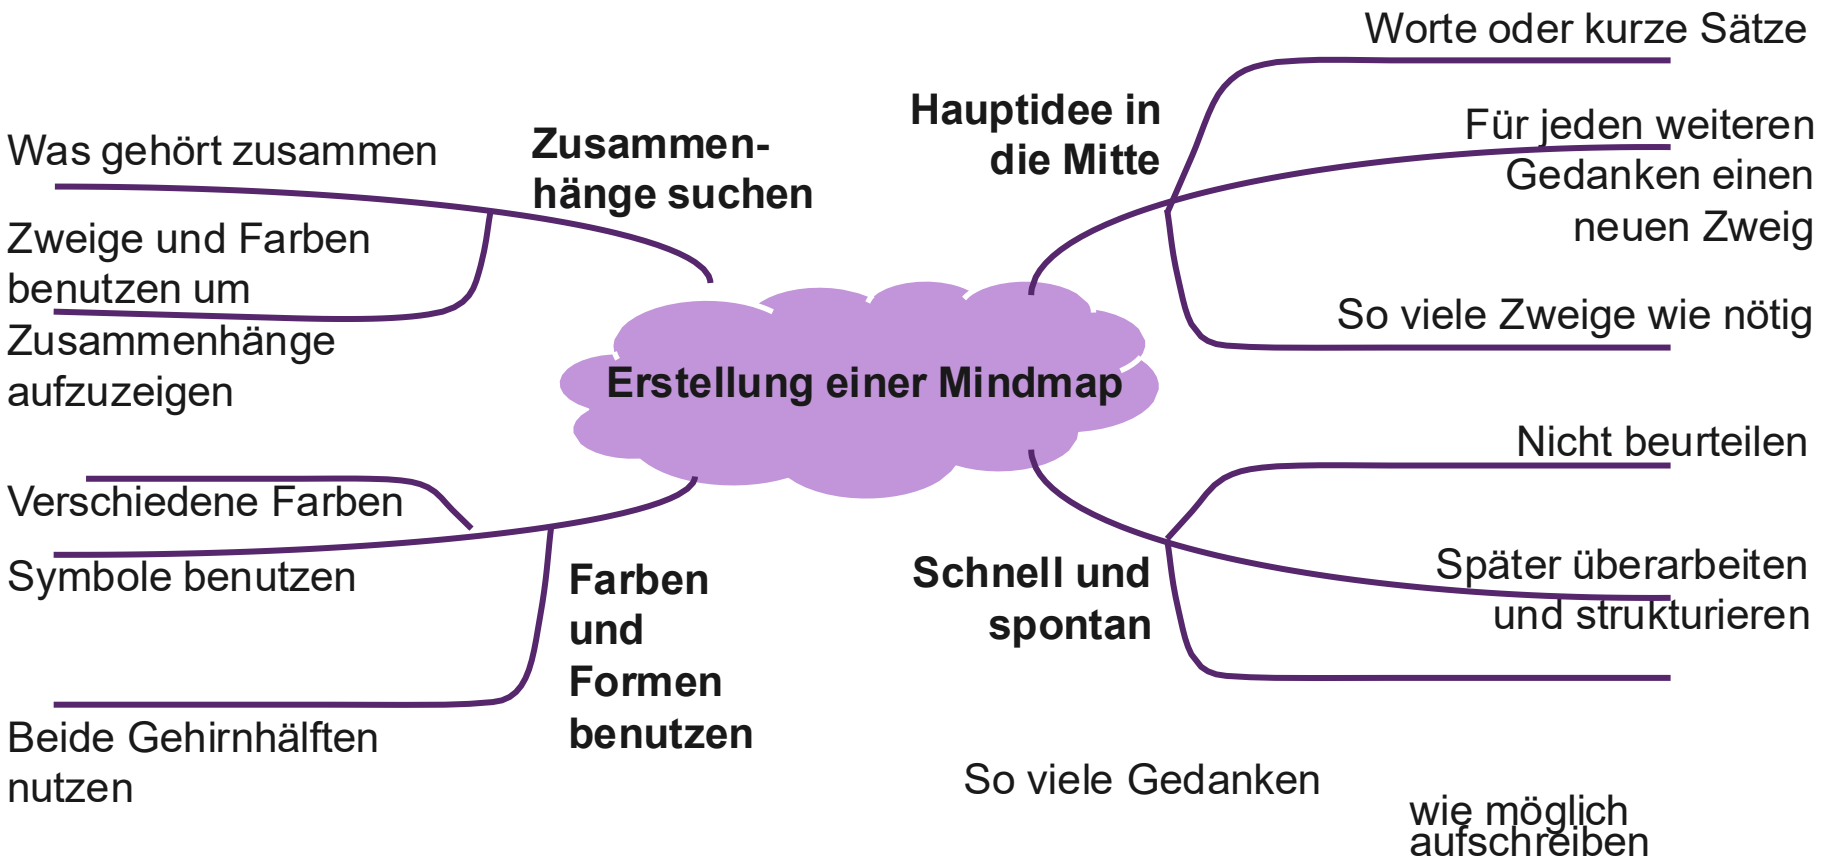

Projektziele

- Projekte und ihre Ziele müssen im Einklang stehen mit der **Strategie** und dem **Leitbild** des Unternehmens.
- Ergebnis-, Termin- und Kostenziele sind Bestandteile der **Projekt-Ziele** und voneinander abhängig. Die Herausforderung liegt darin, einen möglichst guten Zielabgleich zu finden (**Triangle of Constraints:** Scope, Time, Cost **oder auch magisches Viereck:** Zeit, Kosten, Qualität und Umfang **des Projekt-Managements**).

Specific	Spezifisch: Ziel präzise, vollständig und widerspruchsfrei
Measurable	Messbar: Zielerreichung kann festgestellt werden
Action-oriented	Handlungsorientiert: Konkrete Aufgaben, um das Ziel zu erreichen
Realistic	Realistisch: Ziel anspruchsvoll aber erreichbar
Terminable	Terminiert: Genauer Termin, an dem das Ziel erreicht sein soll




Arbeitsauftrag

Am eigenen Projekt

Arbeitsauftrag

Arbeiten sie an Ihren Projektanträgen.

- Welches Problem(e) wird durch Ihr Projekt wie gelöst?
- Formulieren Sie SMART Projektziele, welche in einem Projektantrag beschrieben warden können?
- Überlegen Sie welche Rahmenbedingungen ihr Projekt unterliegt?
- Welche Stakeholdergruppen haben Sie im Projekt?

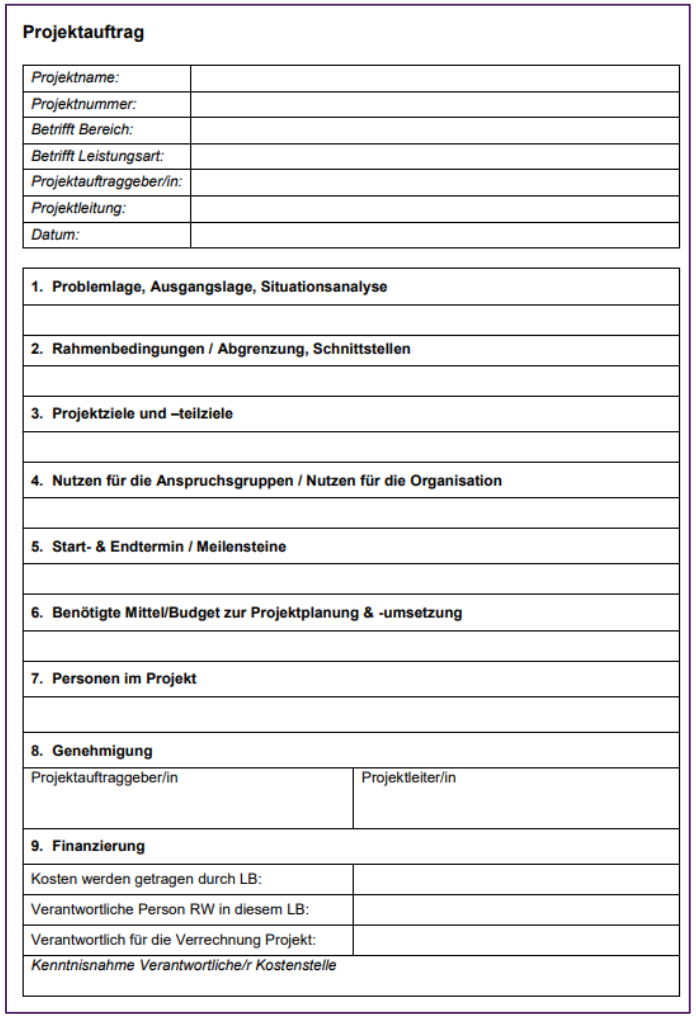

Projektauftrag

Projektname:	
Projektnummer:	
Betrifft Bereich:	
Betrifft Leistungsart:	
Projektauftraggeber/in:	
Projektleitung:	
Datum:	

1. Problemlage, Ausgangslage, Situationsanalyse
2. Rahmenbedingungen / Abgrenzung, Schnittstellen
3. Projektziele und –teilziele
4. Nutzen für die Anspruchsgruppen / Nutzen für die Organisation
5. Start- & Endtermin / Meilensteine
6. Benötigte Mittel/Budget zur Projektplanung & -umsetzung
7. Personen im Projekt
8. Genehmigung

Projektauftraggeber/in	Projektleiter/in

9. Finanzierung	
Kosten werden getragen durch LB:	
Verantwortliche Person RW in diesem LB:	
Verantwortlich für die Verrechnung Projekt:	
Kenntnisnahme Verantwortliche/r Kostenstelle	

OST

Beispiel für ein Projekt im Gesundheitswesen: EPD

- Die Spitalleitung hat entschieden, das EPD in Ihrem Spital einzuführen.
- Sie werden damit beauftragt, in Ihrer Abteilung Abklärungen vorzunehmen, damit eine Einführung des EPD gelingt.
- **Materialien:** Schauen Sie zunächst das Video zum EPD. Nutzen Sie den Text "Projektauftrag" von Mayrs
- **Diskutieren Sie und entwickeln Sie eine grobe Vorgehensweise.**
- Welche Fragen müssen Sie geklärt haben, um den Auftrag anzunehmen?

https://youtu.be/AnBC41a4FFM

Beispiel für ein Projekt im Gesundheitswesen: EPD

