

OST
Ostschweizer
Fachhochschule

Projektmanagement (PROM)
LB 3: Organisation

Prof. Dr. Michael Gino Kraft

Michael.kraft@ost.ch


Departement Wirtschaft

Agenda



LB 1	Einführung
LB 2	Grundlagen Projektmanagement
LB 3	Projektorganisation
LB 4	Projektplanung
LB 5	Teambildung und -entwicklung
LB 6	Projektsteuerung und –kontrolle
LB 7	Gruppenpräsentation

Phasenmodell zum Projektmanagement - Exkurs

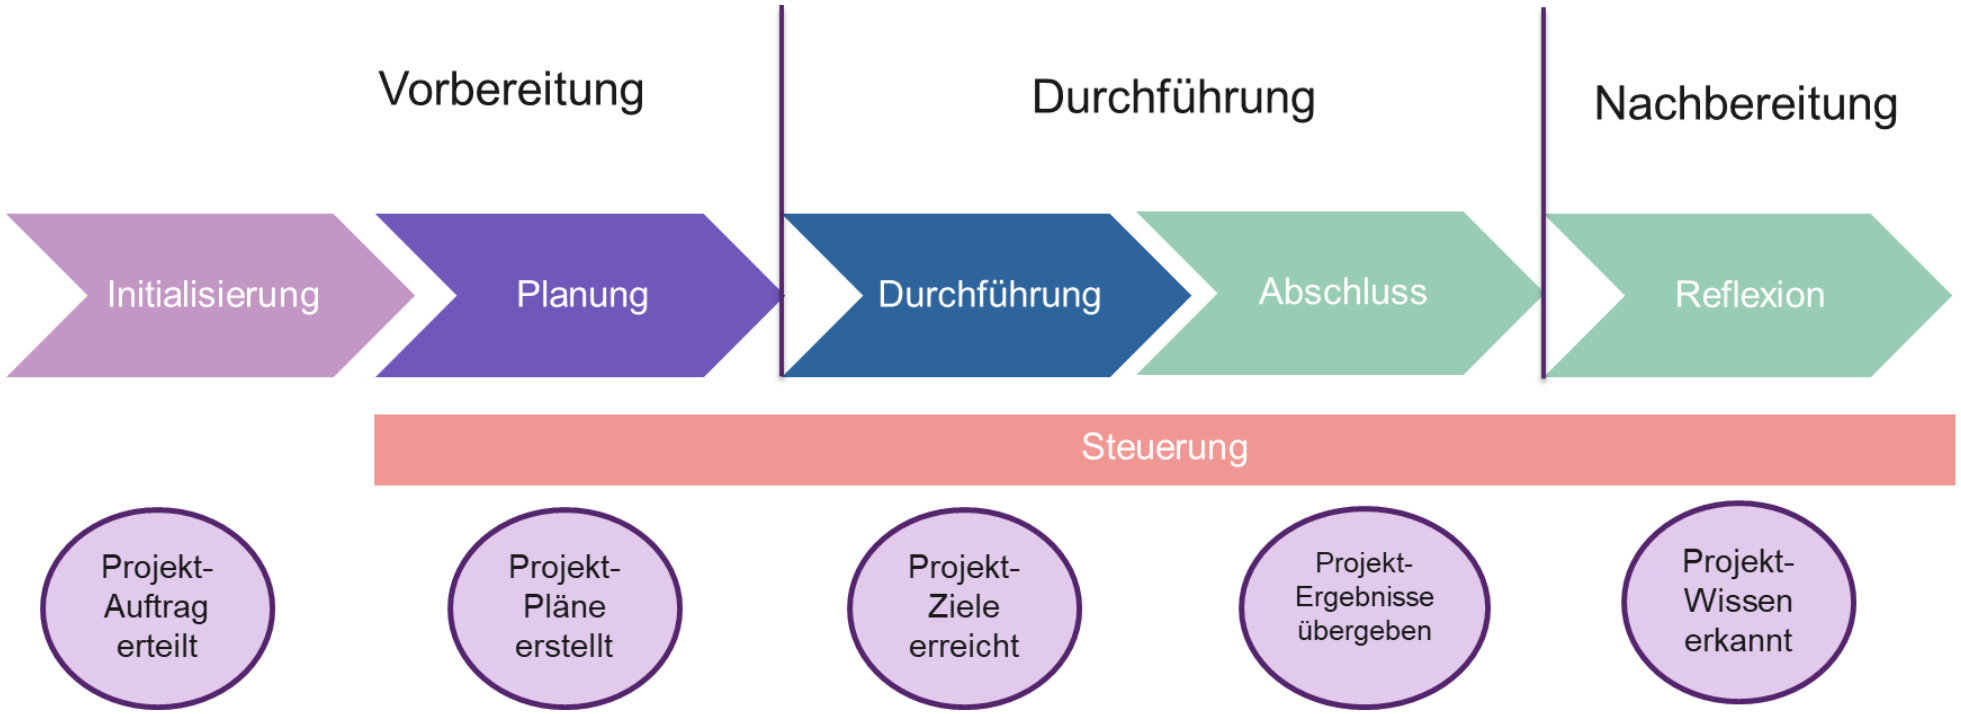

Planung

Projektorganisation

- Eine Projektorganisation ist eine Organisationsstruktur, die explizit für das Projekt und alle daran Beteiligten geschaffen wird.
  - Die Etablierung einer eigenen, von der Linie abweichenden Projektorganisation ist ein wesentliches Element in der Startphase eines Projektes
  - Die Projektorganisation ist ein wertvolles Instrument um die soziale Komplexität, die jedes Projekt aufweist, in den Griff zu bekommen
  - Die Projektorganisation bildet die Basis für die Definition von Informations-, Entscheidungs- und Eskalationswegen – kurz: die Grundlage für effizientes Arbeiten wird geschaffen.

Warum organisieren wir?


OST

Ziele von Projektorganisation

- Schaffung von Transparenz im Projekt
- Regelung der Zusammenarbeit der am Projekt beteiligten Personen
- Aufzeigen der Entscheidungs-, Berichts- und Eskalationswege
- Verkürzung der Kommunikationswege
- Klare Aufgaben- und Kompetenzverteilung durch die Definition von Funktionen und Rollen
- Schaffung der Grundlage für die Projektkommunikation /-information

Arten von Projektorganisationen

- Reine Projektorganisation

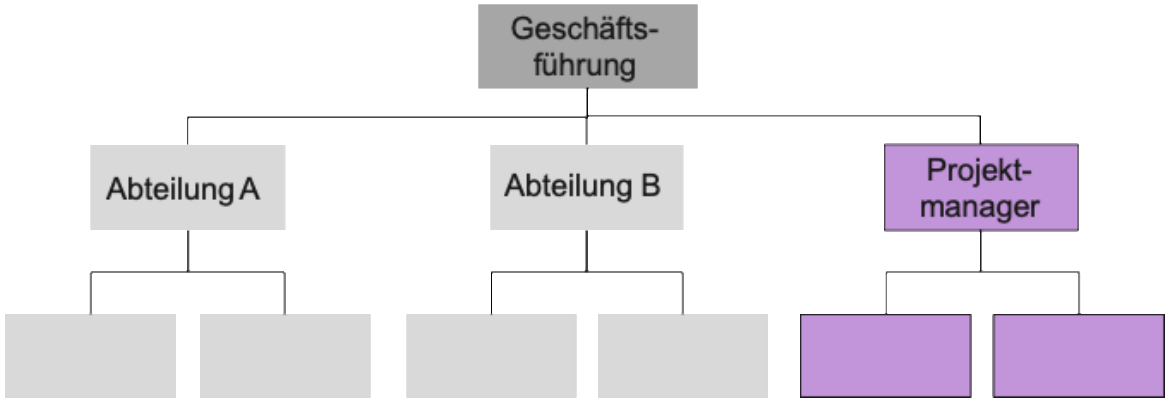

- Projektteam wird als **zeitlich befristete Organisationseinheit** gebildet
- Mitglieder arbeiten **vollständig im Projekt**, losgelöst von ihrer Stammabteilung
- Besonders geeignet für **große Veränderungsprojekte** (z. B. Einführung neuer Klinik-IT-Systeme, Bau neuer Stationen)


- Vorteile:

- Nachteile:

OST

Arten von Projektorganisationen

- Matrix Projektorganisation

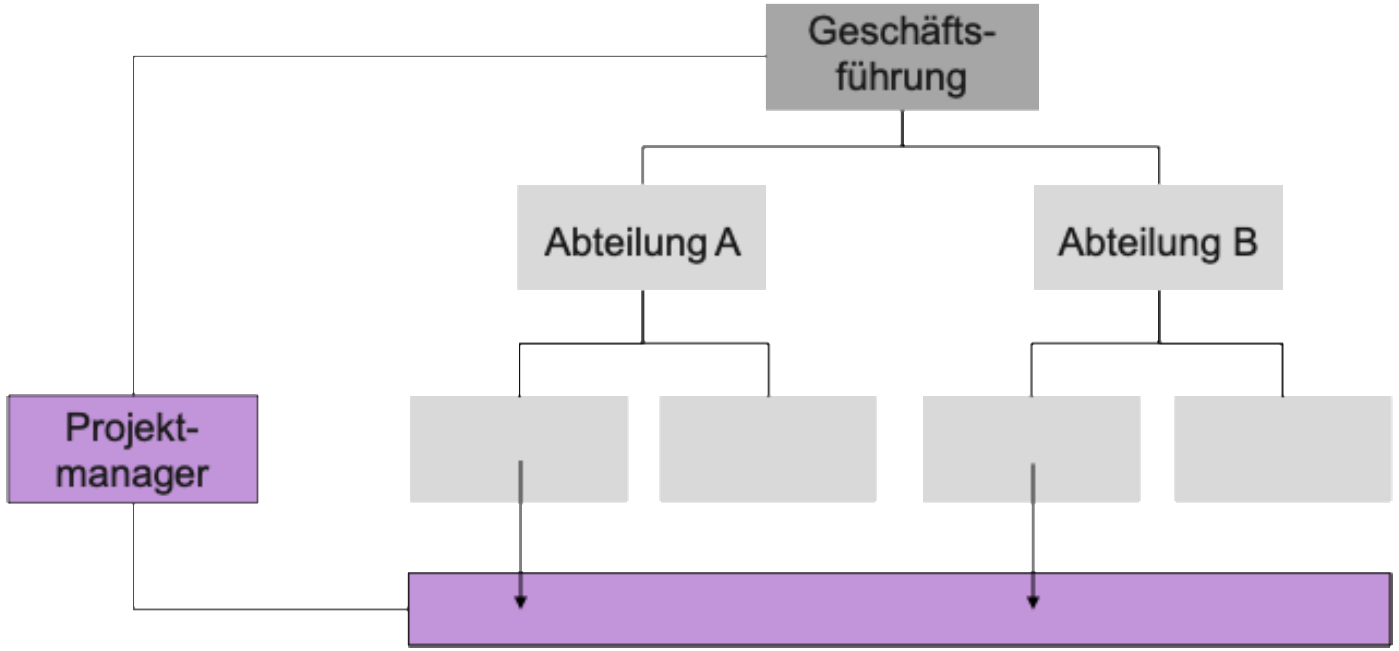

- Die Verantwortung wird zwischen Projektleitung und Linienvorgesetzten geteilt (Doppelunterstellung).
- Die Projektmitglieder bleiben in ihrer Abteilung, arbeiten aber gleichzeitig am Projekt.
- Die Projektleitung hat fachliche Weisungsbefugnis für die Projekttätigkeiten.


- Vorteile:

- Nachteile:

OST

Arten von Projektorganisationen

- Projektstab

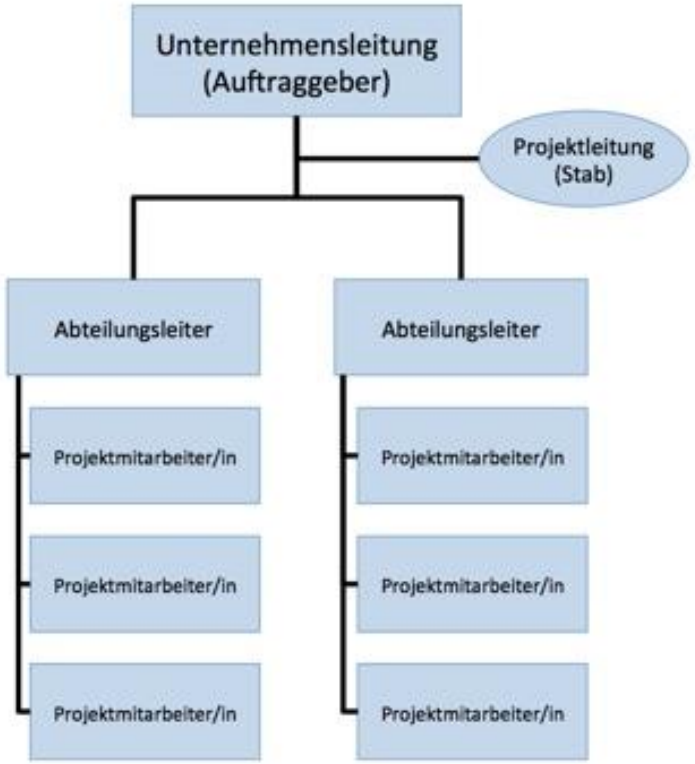

- Die Projektleitung arbeitet unterstützend und beratend, hat jedoch keine direkte Weisungsbefugnis.
- Die Hauptverantwortung bleibt bei der Linienorganisation (z. B. Klinikleitung, Pflegedienstleitung).
- Diese Vorgehensweise eignet sich für kleinere Projekte oder Pilotvorhaben im Gesundheitswesen.

- Vorteile:

- Nachteile:

OST

Kriterienauswahl zur Projektorganisation

Projekt-Organisation / Projekt-Merkmale	Stab-Projekt-Organisation	Matrix-Projekt-Organisation	Reine Projekt-Organisation
Verteilung der Projekt-Arbeiten (%) 100 / 50 / 0	Fachabteilungen		Projekt-Team
■ Neuigkeitsgrad ■ Komplexität ■ Umfang	niedrig gering klein	mittel mittel mittel	hoch gross gross
Typische Teamgrösse (Anzahl Personen)	1–6	5–30	20–100
Beispiele	Marketing- und Vertriebs-Projekte	Produktentwicklungs-Projekte	Luft- und Raumfahrt-Projekte

OST

Übung: Projektorganisation Arten


15 min. Zeit

- Welche Stärken und Schwächen haben die unterschiedlichen Arten der Projektorganisation.
- Wann macht welche Projektorganisation im Gesundheitswesen am meisten Sinn? Geben Sie praktische Beispiele an.



OST

Rollen in einem mittelgrossen Projekt

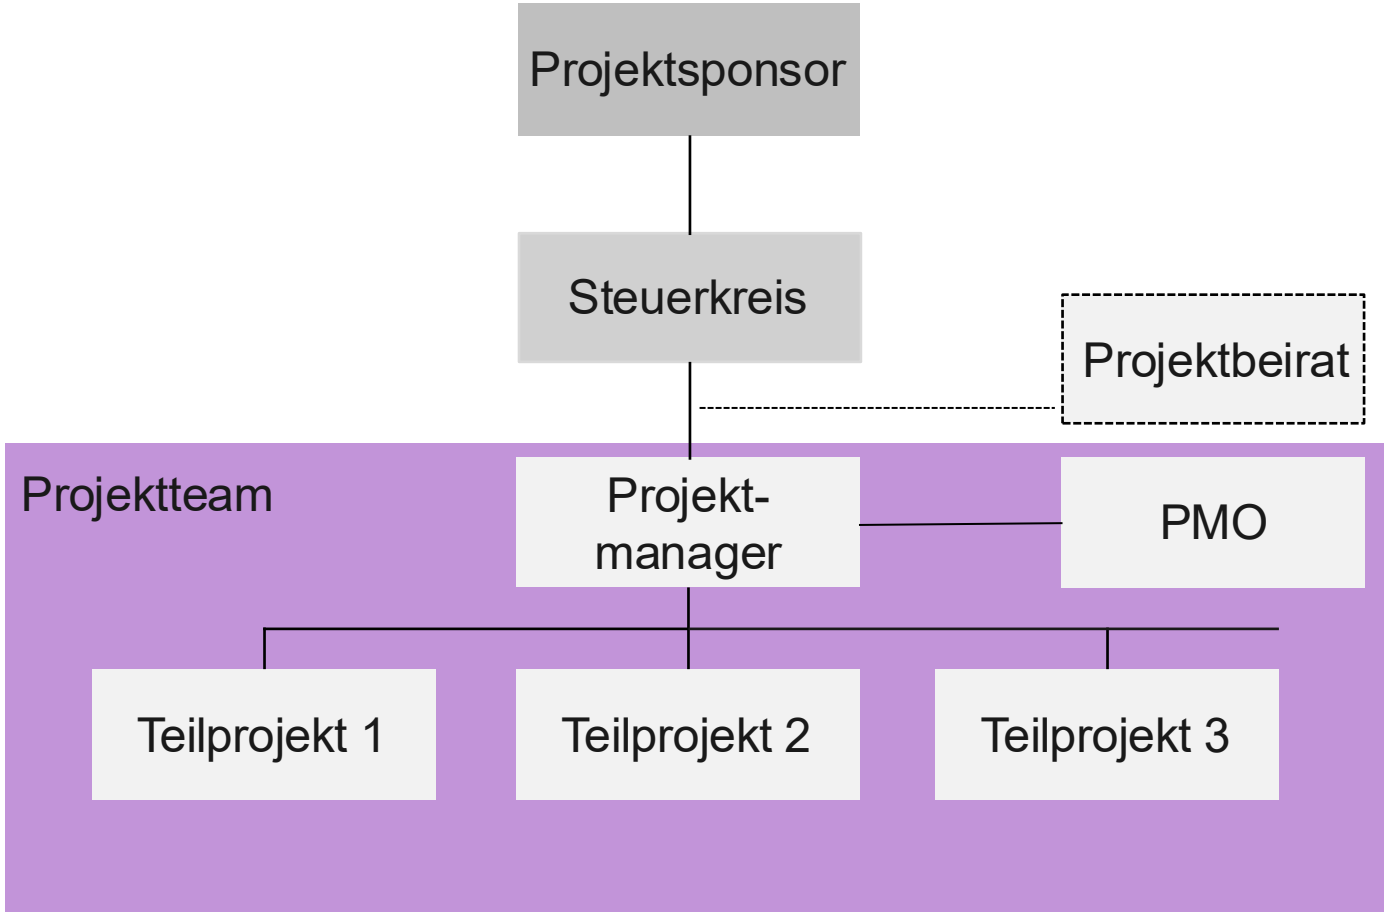

OST

Aufgaben im Projektmanagement

- Die Projektleitung nimmt die operative Führung des Projektes wahr, d.h. ist verantwortlich für
  - **Projektvereinbarung** mit Auftraggeber; allenfalls Beschaffung von erforderlichen **Ressourcen**;
  - Bildung des **Projektteams**, ev. zusammen mit Auftraggeber,
  - Durchführung des **Projektstarts**;
  - **Strukturierung** des Projektes in Phasen, Teilprojekte und Meilensteine, soweit nicht bereits in Auftrag vorgegeben;
  - **Koordination** verschiedener Teilprojekte und Aktivitäten;
  - Projekt-Planung, -Kontrolle und –Steuerung bezüglich **Termine, Personaleinsatz, Kosten;**

Aufgaben des Auftraggebers

- Formulierung des **Projektauftrages** mit Grobziel und Rahmenbedingungen.
- **Ernennung des Projektleiters**, Festlegung der grundsätzlichen **Projekt-Organisation** und der **Entscheidungskompetenzen des Projektleiters** gegenüber der Linienhierarchie. Eine zweckmässige Form der Kompetenzregelung ist das Funktionendiagramm (vgl. Folie im Teil Kompetenzen).
- Festlegung von gewünschten **Projektphasen** und Meilenstein-Entscheiden zwischen den einzelnen Phasen.
- **Fällen von Meilenstein-Entscheiden** (Freigabe-Entscheiden).


- → Je nach Grösse der Projekte können diese Aufgaben auch durch den Projektausschuss (strategische Führung) wahrgenommen werden.

Rollenklärung im Projekt

Rolle	Verantwortungen	Kompetenz
Projektleiter	• Projektvereinbarung mit Auftraggeber; • allenfalls Beschaffung von erforderlichen Ressourcen; • Bildung des Projektteams, ev. zusammen mit Auftraggeber, • Durchführung des Projektstarts; • Strukturierung des Projektes in Phasen, Teilprojekte und Meilensteine, soweit nicht bereits in Auftrag vorgegeben; • Koordination verschiedener Teilprojekte und Aktivitäten; • Projekt-Planung, -Kontrolle und –Steuerung bezüglich Termine, Personaleinsatz, Kosten;	• Fachkompetenz: – Erkennen der Zusammenhänge – Kennen der Fachsprache • Methodenkompetenz: – Strukturierungs- und Planungsmethoden – Problemlösungsmethoden – Vorgehensmethoden • Sozialkompetenz – Kontaktfreudigkeit, Beziehungsfähigkeit – Risikofreudigkeit, leben mit Unsicherheiten • Selbstkompetenz – Selbstorganisation, Zeitmanagement

OST

Rollenklärung des PL

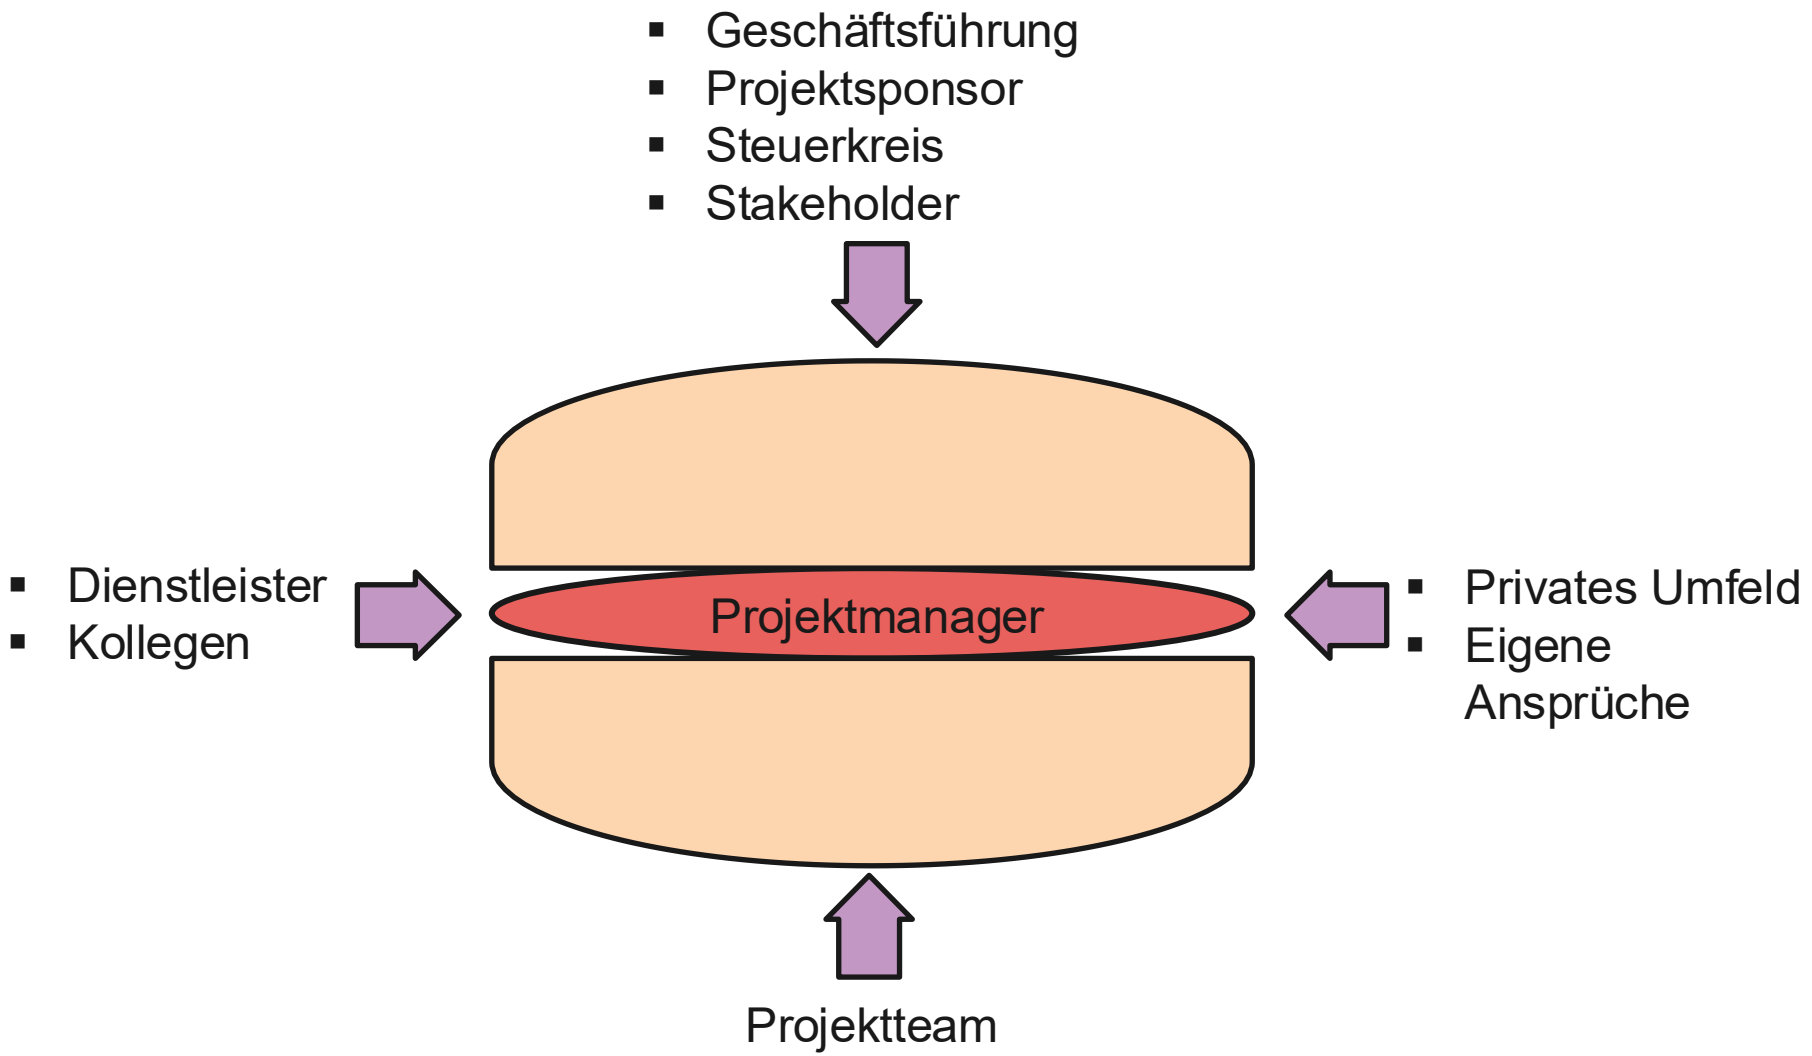

OST

Rollenklärung im Projekt


Rolle	Verantwortungen	Kompetenz
Projektmitarbeiterin	• Aufträge zuverlässig ausführen • Idee mit tragen, hinter der Idee stehen • Motiviert mitarbeiten • Fehler melden • Ressourcenengpässe • Status-Meldung zu eigenen Arbeiten • Zeitmanagement • Konflikte melden, Stimmung mitteilen frühzeitig	• Fachkompetenz: – Expertise Fachthemen des Projektes – Interdisziplinäre Kompetenz • Methodenkompetenz: – Analyse-Methoden – Technische Methoden • Sozialkompetenz – Konflikte ansprechen können – Offen, Zugänglichkeit • Selbstkompetenz – Eigeninitiative & Eigenverantwortung – Selbstständiges Arbeiten & Mitdenken – Freude an der Sache – motiviert

OST

Übung: Projektorganisation Arten

10 min. Zeit

- Welche Kompetenzen werden in der jeweiligen Projektrolle benötigt? Schreiben Sie die unt. Kompetenzen auf und geben Sie konkrete Beispiele dazu.
  - PL
  - PMA
  - Projektcontroller

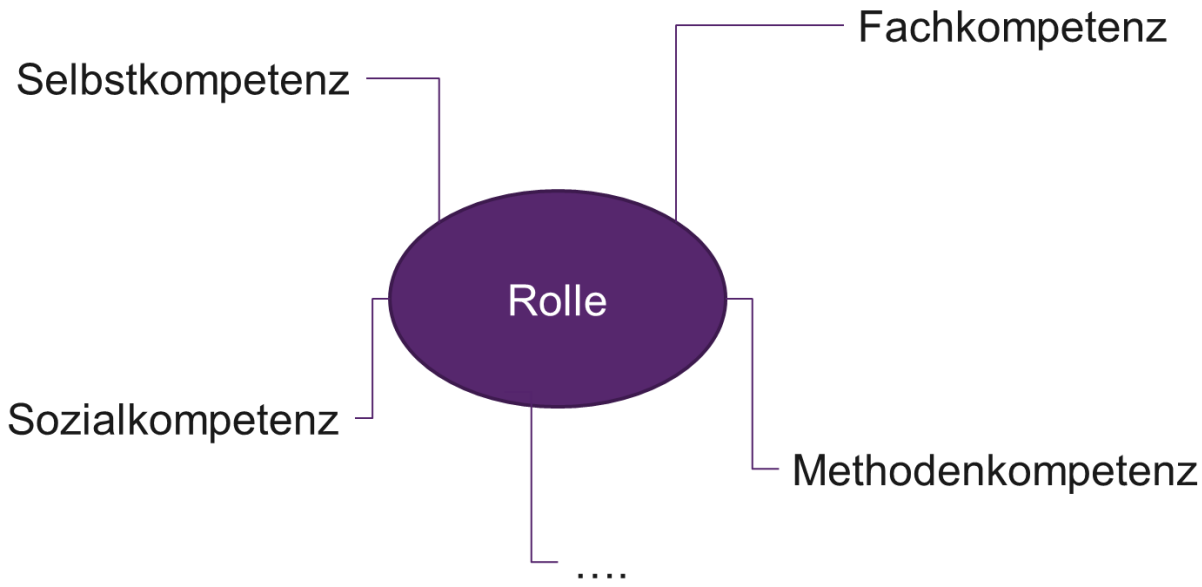

OST

Stakeholdermanagement



Wem «gehört» das Projekt?


Wer ist betroffen?

Wie stehen die Stakeholder zum Projekt?


Projekte müssen sich an die Stakeholder orientieren.

OST

Stakeholder-Gruppen

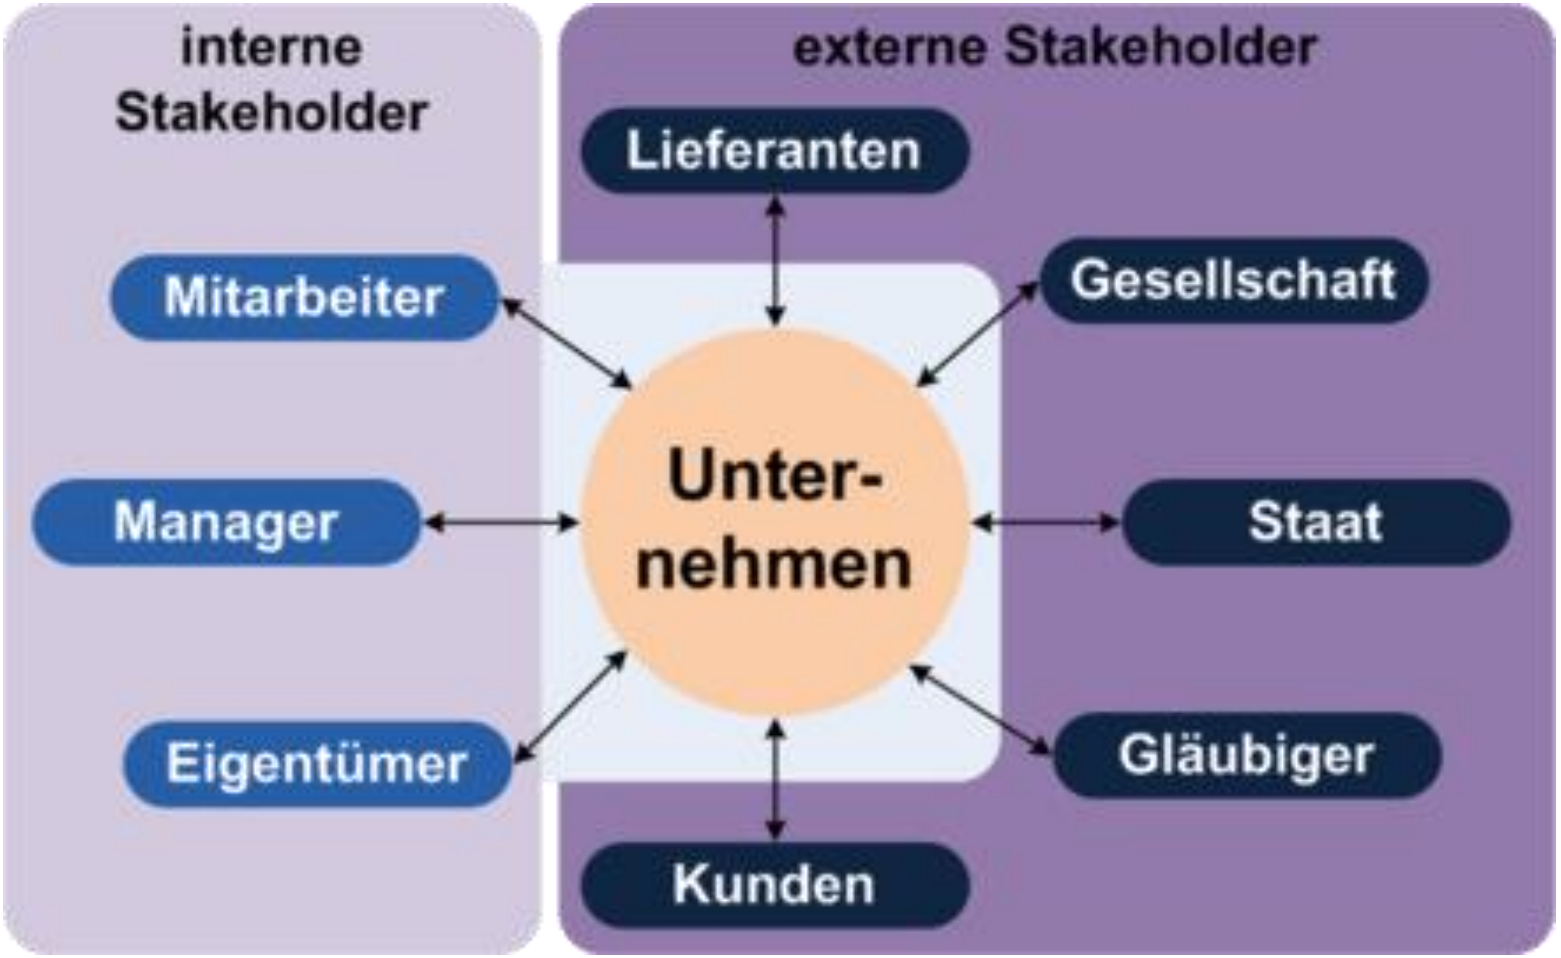

Stakeholderpriorisierung

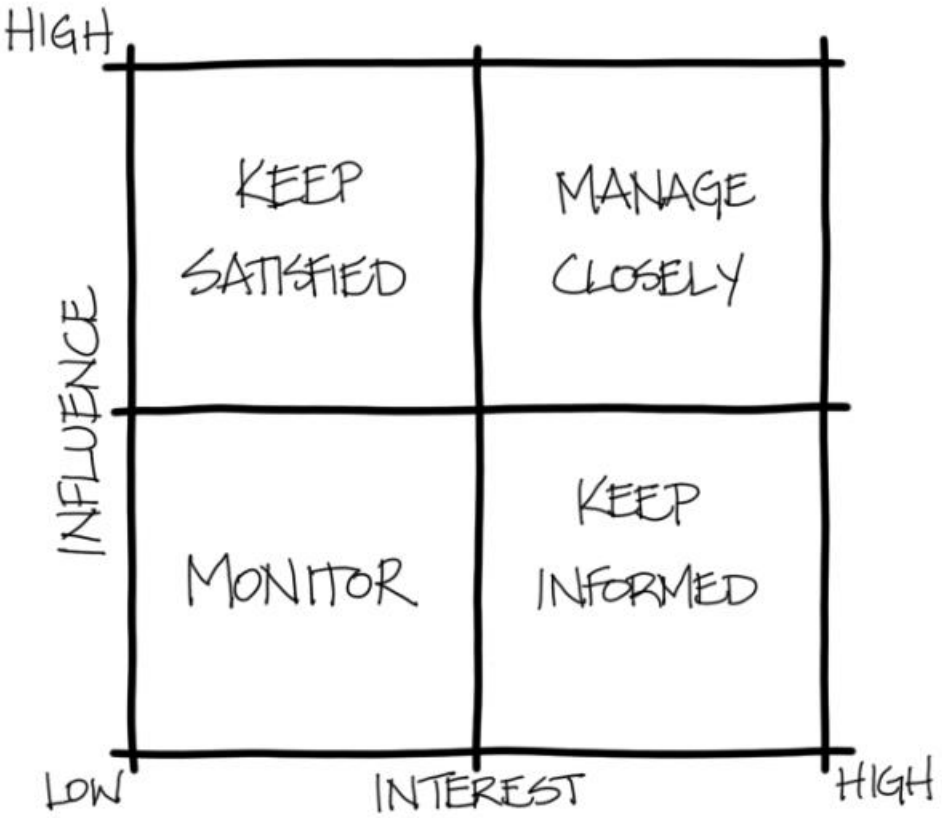

1. Überlegen Sie,
   wer sind die Stakeholder

2. In welchem Bereich lassen sich die Stakeholder verorten?

3. Welche Massnahmen eignen sich für die Stakeholder?

OST



Arbeitsaufträge/Übung

Am eigenen Projekt

Arbeitsaufträge am eigenen Projekt

Bearbeiten Sie für ihr eigenes Projekt die folgenden Themen:

- Zieldefinition
- Definition der Projektorganisation
- Klärung der Projektrollen
- Stakeholder-Analyse

Sie haben 20 Minuten Zeit hierfür.

Definieren der Projekt-organisation

- Welche der drei Organisationsformen (Stabs-, Matrix- und reine Projekorganisation) verwenden Sie in Ihrem eigenen Projekt?
- Begründen Sie Ihre Wahl!
- Warum eigenen sich die anderen Formen weniger gut?

OST

Klären der Projekt-Rollen

- ProjektmitarbeiterIn
  - Verantwortlichkeiten
  - Kompetenzen

- ProjektleiterIn
  - Verantwortlichkeiten
  - Kompetenzen

Stakeholder Analyse

Analysieren sie ihr eigenes Projekt hinsichtlich möglicher Stakeholder. Definieren sie mögliche Massnahmen!

	Wer/Was behindert das Projekt	Wer/Was unterstützt das Projekt
1		
2		
3		
...		
