

OST
Ostschweizer
Fachhochschule

Projektmanagement (PROM)
LB 6: Projektsteuerung & -controlling

Prof. Dr. Michael Gino Kraft

Michael.kraft@ost.ch


Departement Wirtschaft

Agenda




LB 1	Einführung
LB 2	Grundlagen Projektmanagement
LB 3	Projektorganisation
LB 4	Projektplanung
LB 5	Teambildung und -entwicklung
LB 6	Projektsteuerung und –kontrolle
LB 7	Gruppenpräsentation

Projektphasen

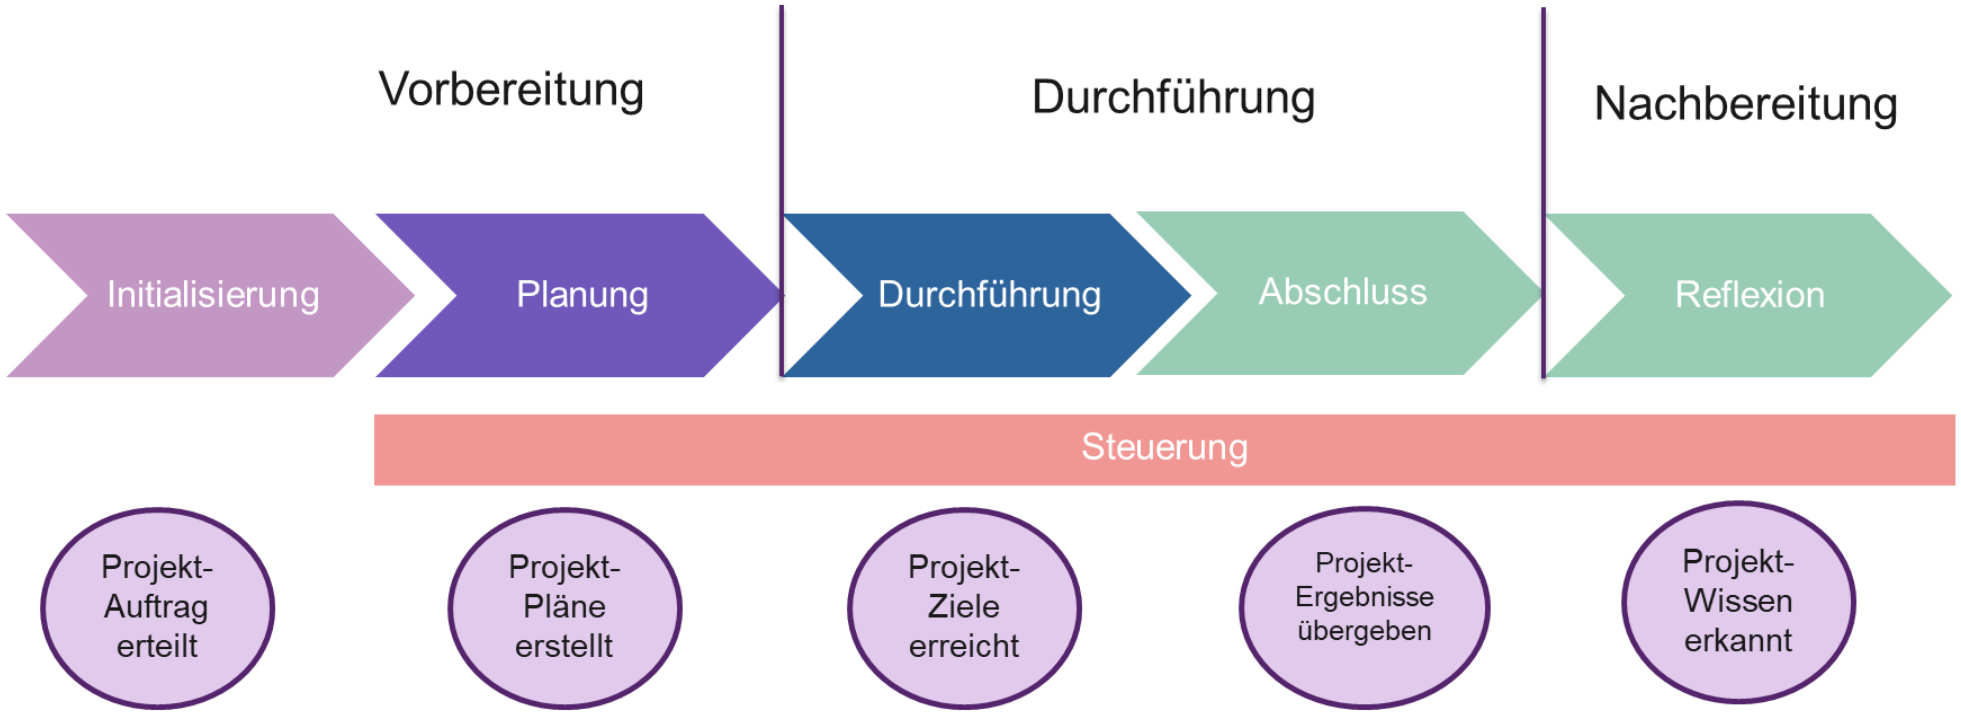

OST

Projektcontrolling

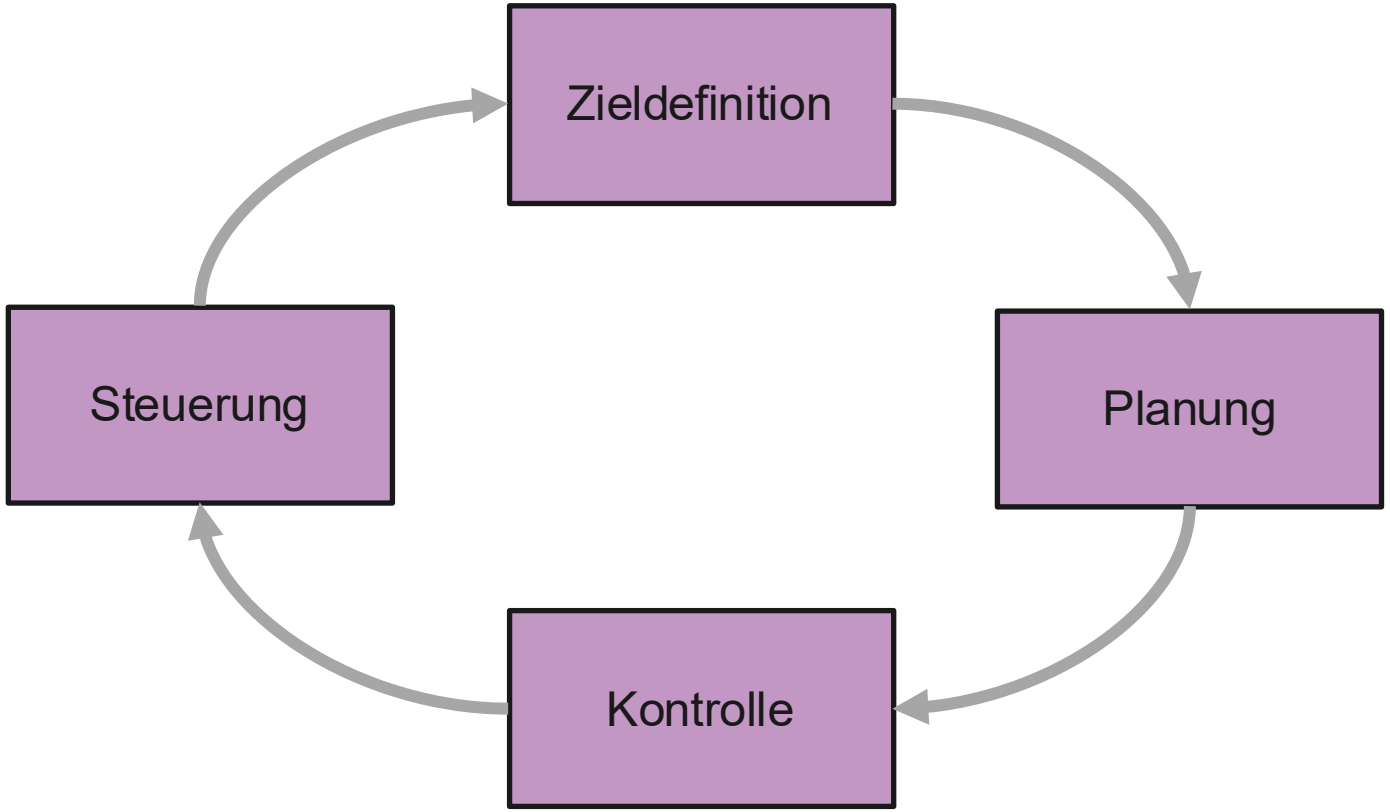


Aufgaben und Relevanz des Controlling

- Statusfeststellung
- Frühwarnsystem zum Projekterfolg
- Datengestützte Entscheidungsgrundlage
- Planungsunterstützung

Statusanalysen

- Aktueller Stand
- Hindernisse
- Vergleich mit Zeitplan, gibt es Abweichungen?
- Zielsetzung zum nächsten Treffen
- Braucht jemand Unterstützung?

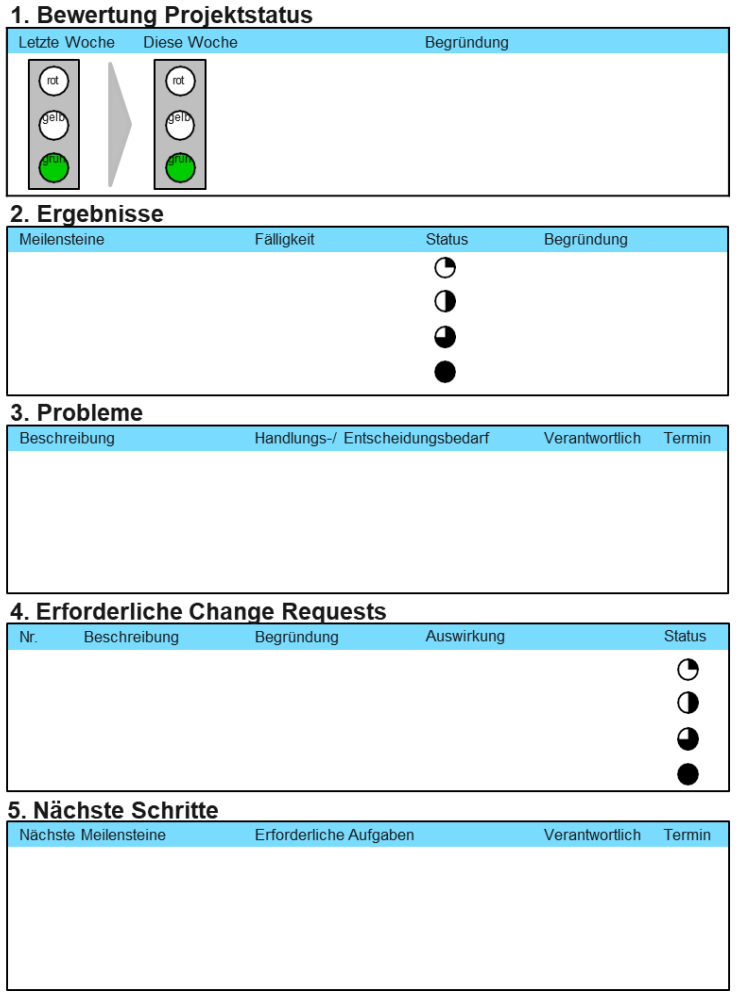

1. Bewertung Projektstatus

Letzte Woche	Diese Woche	Begründung
rot / gelb / grün	rot / gelb / grün	

2. Ergebnisse

Meilensteine	Fälligkeit	Status	Begründung
		◔ ◑ ◕ ●	

3. Probleme

Beschreibung	Handlungs-/ Entscheidungsbedarf	Verantwortlich	Termin

4. Erforderliche Change Requests


Nr.	Beschreibung	Begründung	Auswirkung	Status
				◔ ◑ ◕ ●

5. Nächste Schritte

Nächste Meilensteine	Erforderliche Aufgaben	Verantwortlich	Termin

OST

Statusanalyse mit Tracking-Verfahren

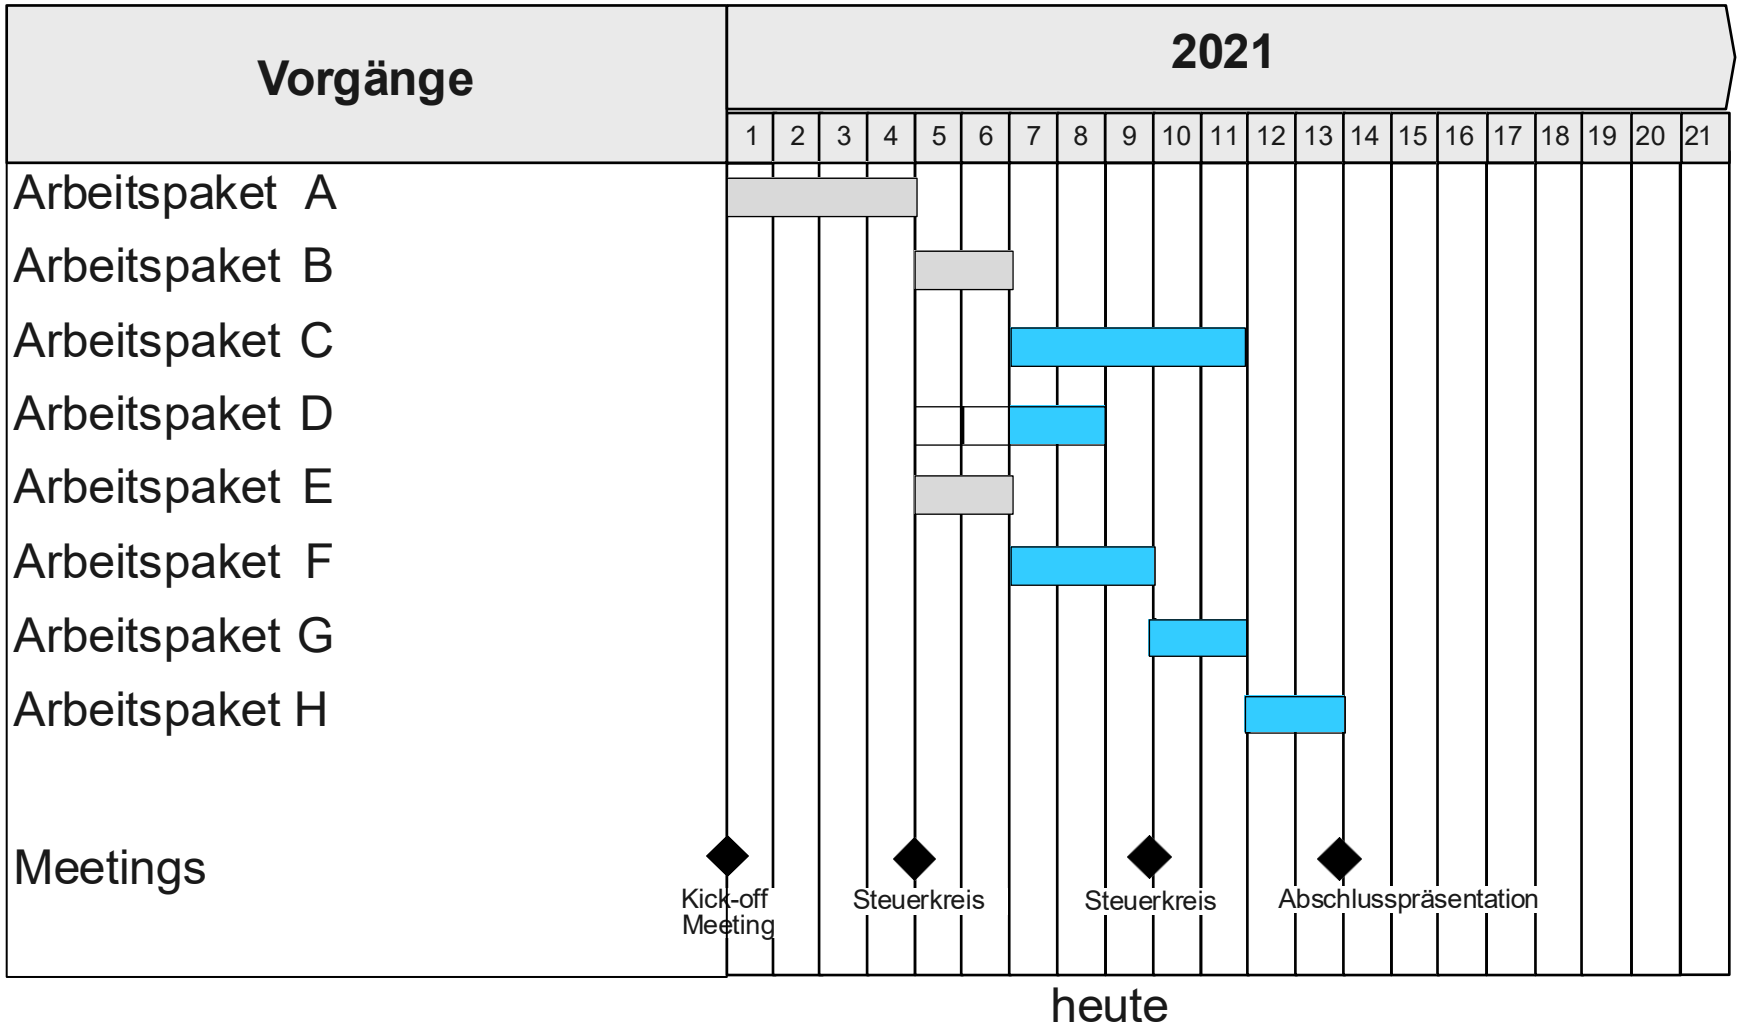

Statusmeetings



Ergebnisse:


1. Wie sieht die gegenwärtige Situation aus?
2. Wie gross ist die Diskrepanz zwischen Soll und Ist?
3. Wer muss was machen bis zum nächsten Statusmeeting?

→ Planung gemäss den aktuellen Entwicklungen anpassen


Moderationsmethode:

1. **Einsteigen:** Ziel, Ablauf, Zeitmanagment
2. **Sammeln:** Themen, gleichberechtigt
3. **Auswählen:** abstimmen über Themen, Teammitglieder wissen oft besser was ansteht
4. **Bearbeiten:** sammeln Ideen, lösen Probleme, fällen Entscheidungen
5. **Planen:** tatsächliche Arbeitspakete planen, nach Kompetenzen
6. **Abschliessend:** reflektieren über das Meeting

Soll-Ist-Analysen in Kosten

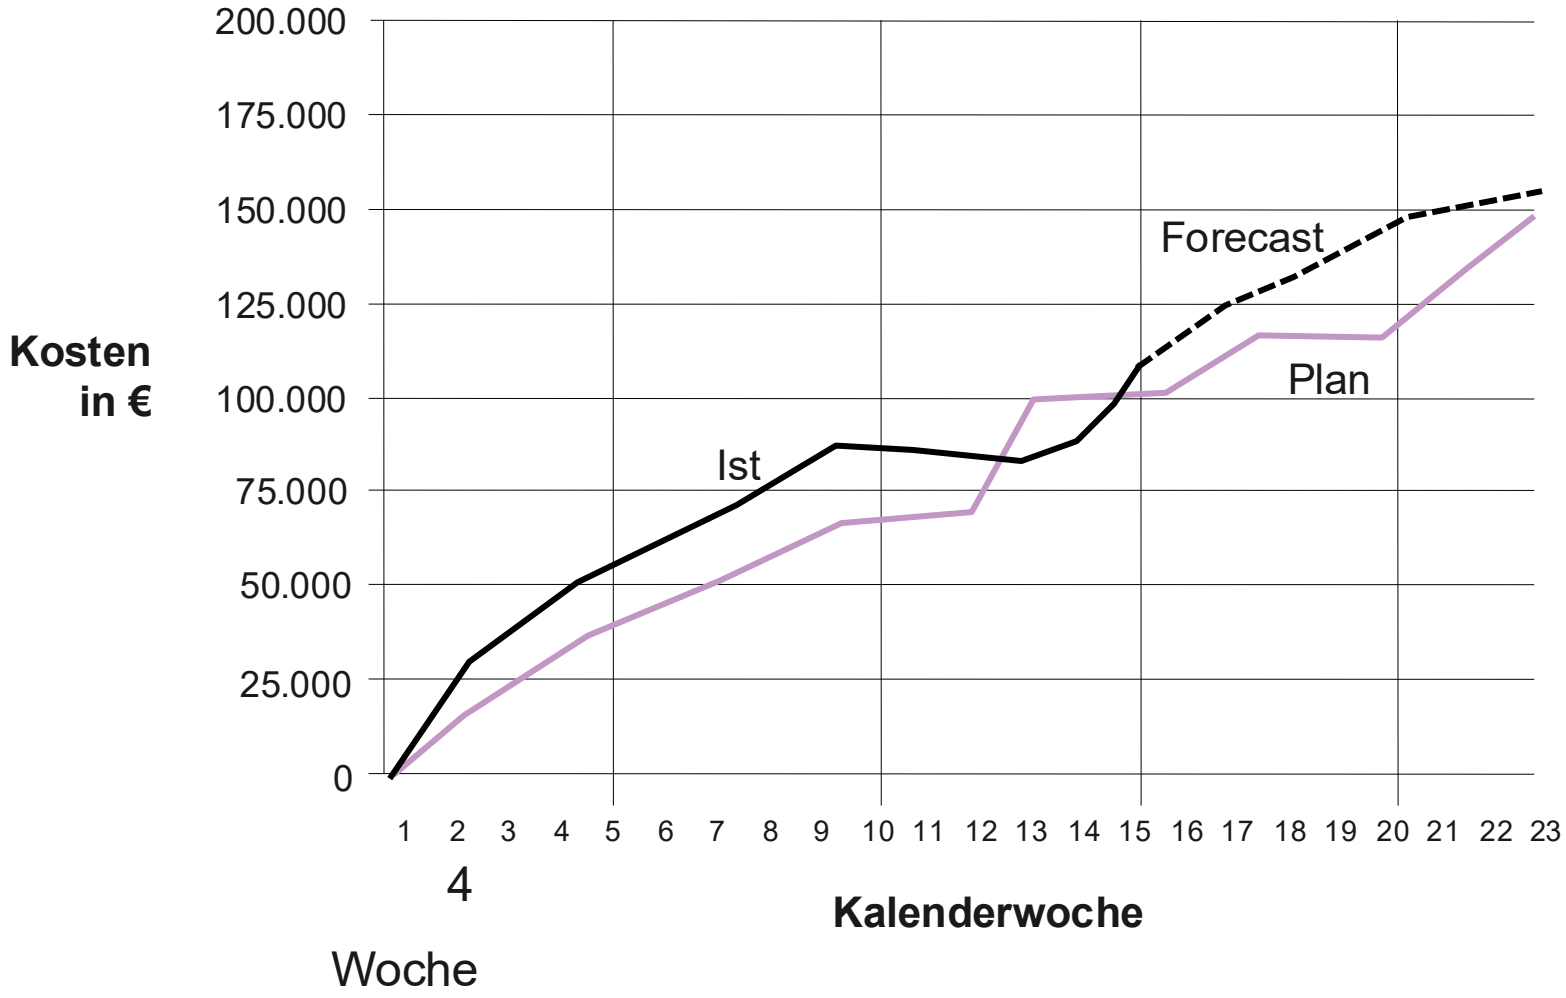

Soll-Ist-Analysen in Kapazitäten

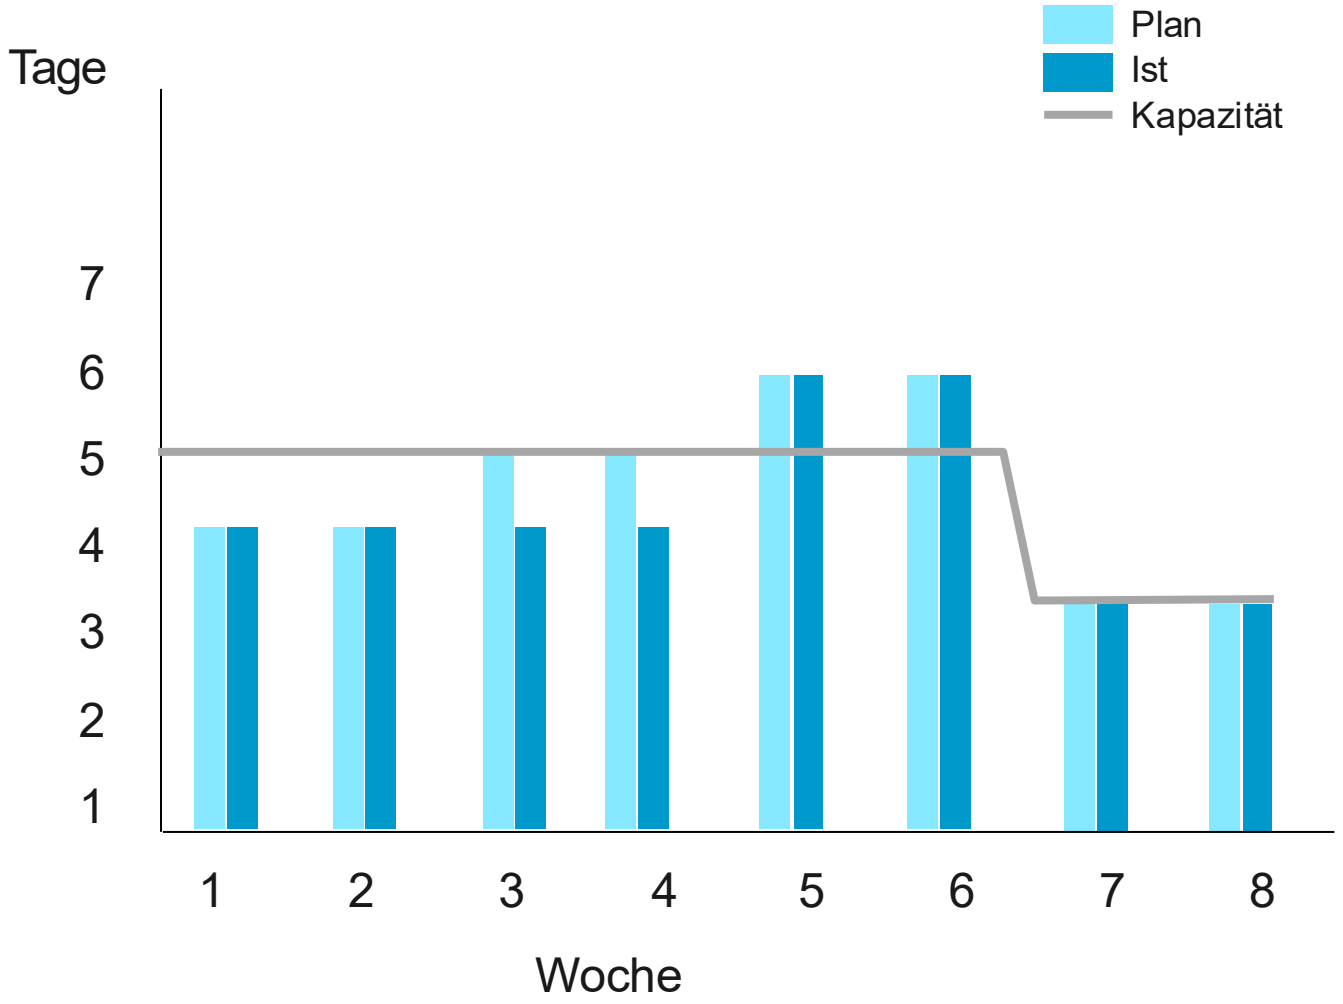


OST

Projektsteuerung

- Jederzeit können (projektintern bedingte oder externe) **Ereignisse** eintreten, die auf das Projekt grössere Auswirkungen haben

- Jedes Ereignis muss hinsichtlich seiner **Auswirkungen auf das Projekt** vom Projektleiter untersucht werden, insbesondere hinsichtlich seiner **Auswirkungen auf die Leistungs-, Termin- und Kostenziele**

- Falls die Auswirkungen den geplanten Projektrahmen sprengen, sind die **übergeordneten Gremien** schnellst möglich zu **informieren** (Eskalation)

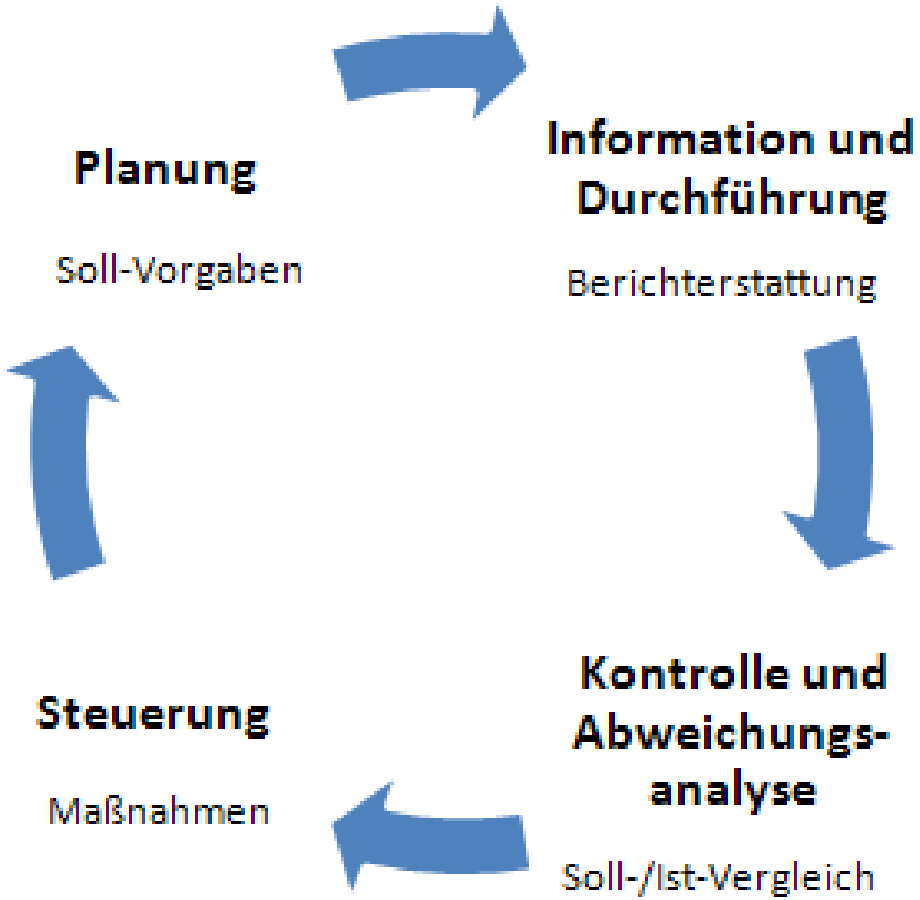

20 Minuten


Übung Bodenseespital (Moodle)

- In Ihrer Tätigkeit als Projektleiter/-in beim Bodenseespital bemerken Sie im Zuge eines
- Entwicklungsprojektes, dass das Projekt bezüglich der Termineinhaltung gefährdet ist.
- Es sind am Stichtag 1. Oktober noch 30% der Arbeiten zu erledigen, es stehen jedoch nur noch 10% der ursprünglich geplanten Zeit zur Verfügung.

- a) Welche mindestens 3 Massnahmen könnten Sie als ProjektleiterIn in dieser Situation ergreifen, um dem Problem zu begegnen?
- b) Welche negativen Folgen könnten diese Massnahmen jeweils nach sich ziehen?

OST

Projektabschluss

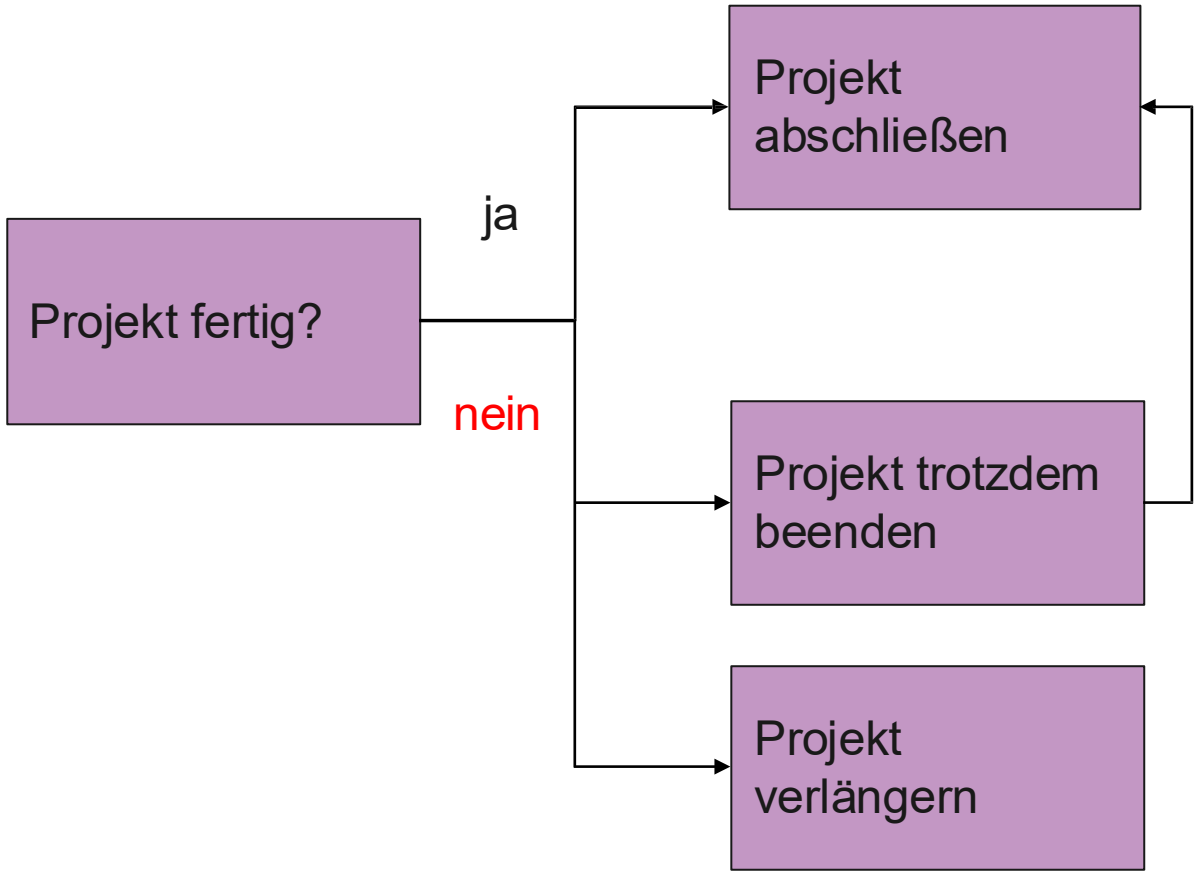

Projektabschluss

- Die Abschlussphase in einem Projekt bedarf der **besonderen Sorgfalt** des Projektleiters, ist doch am Ende eines Projektes sehr oft die **Situation** so, dass
- die Energie der Beteiligten aufgebraucht zu sein scheint;
- die am Projekt Beteiligten sich bereits auf neue Aufgaben konzentrieren;
- die anstehenden Abschlussarbeiten generell wenig motivierend sind;
- kein Geld mehr zur Verfügung steht, da die Aufwendungen für die Abschlussarbeiten ungenügend hoch budgetiert wurden.



Aktivitäten beim Projektabschluss

- Projektablage
- Projekt-Abschlussbericht
- Schlussabrechnung
- Projekt-Dokumentation
- Projekt-Erfolgskontrolle

OST

Projektabschlussdokumentation

Der Projekt-Abschlussbericht ist für die **betriebsinterne** Verwendung vorgesehen.

- Beurteilung des Projektablaufes (Positives; Negatives; Verbesserungen)
- Wertung von massgebenden Störfaktoren
- Wertung der Zielerreichung
- Darlegung/Begründung von Zielabweichungen
- Zusammenstellung wichtiger, massgebender Projektrandbedingungen
- Beurteilung der Projektwirtschaftlichkeit
- Erkenntnisse für kommende Projekte
- Wertung der Teamarbeit
- Schlussabrechnung



OST

Themenkatalog zur Dokumentation des Abschlussberichts

1. Ausgangssituation des Projekts: Leistungsumfang und Projektziele lt. Auftrag einschließlich der Änderungen.
2. Projektmanagement: Rollen und Verantwortlichkeiten, Ablauf mit Phasenplan und Meilensteinen, Projektstrukturplan, Abweichungen.
3. Projektergebnis: Umfang und Qualität der Lieferobjekte und Vergleich mit den Anforderungen.
4. Gesamtbeurteilung.
5. Erkenntnisse und Konsequenzen für die Zukunft.

Projektabschluss im Projektverlauf

Projekt-Phase / Kriterien	Definition	Planung	Durchführung	Abschluss
Hauptaufgaben/ -aktivitäten	Projekt-Ziele (Ergebnis-, Termin-, Kostenziele) fest-legen	Spezifikationen, Termin-, Ressourcen-Pläne erstellen	Steuerung, Kontrolle, Korrekturmass-nahmen durchführen	technische und administrative «Aufräumarbeiten»
(eventuelle) Unter-phasen	■ Ideenfindung ■ Konzeptfindung ■ Machbarkeits-untersuchung	■ Grobplanung ■ Feinplanung	■ Entwicklung ■ Fertigung ■ Vertrieb/Betrieb	■ Projekt-Bewer-tung ■ System-Ausser-dienststellung/ Entsorgung
Dokumentation	Projekt-Antrag	Projekt-Auftrag	Projekt-Ergebnis-bericht	Projekt-Abschluss-bericht
Kostenanteil (in%) *	< 1	< 10	> 80	< 5
Dauer (in Jahren) *	< 1/4	< 1/2	> 1	< 1/4
* typische Werte für Produktentwicklungs- und Raumfahrt-Projekte				

Projektmappe

- Im Verlaufe eines Projektes entstehen mannigfaltige **Unterlagen**, es handelt sich hierbei um Unterlagen:
- mit reinem **Informationscharakter**
- mit **dokumentarischem** Charakter
- mit **rechtlich verpflichtendem** Charakter
- die das **Projekt-Produkt beschreiben**/definieren
- mit **historischem** Charakter
- Darüber hinaus besteht der **zeitliche Aspekt**, der eine Grobeinteilung erlaubt in Unterlagen,
- die nur während der Projektdauer eine Relevanz haben
- die über das Projektende hinaus relevant bleiben



Projektablage

Eine solche Menge von Unterlagen muss strukturiert abgelegt werden können. Die **strukturierte Ablage** bezweckt

- die Papiermenge möglichst gering zu halten,
- ein rasches Abrufen abgelegter Dokumente sicherzustellen,
- die Dokumente für alle am Projekt Beteiligten bereit zu halten,
- den Verfalltermin der Dokumente sichtbar zu machen (um Ablageraum frei zu halten).
- Der Projektleiter wird am **Anfang** des Projekts die vermutlich anfallenden **Dokumente auflisten**, **klassieren**, ihre **Bedeutung** und ihren **Umfang** schätzen, ihren **Ablageort** und ihre **Ablagedauer** sowie ihren **Archivierungsort** und ihre **Archivierungsdauer** bestimmen.



OST

Check-Fragen am Abschluss-Meeting

«Nach dem Projekt ist vor dem Projekt.»

Aus jedem Projekt können Lehren für nächste Projekte gezogen werden. Welche Themen würden Sie besprechen, wenn Sie für die nächsten Projekte Konsequenzen ableiten und sich stets verbessern wollten?

Denken Sie dabei an die prozessualen und ergebnisbezogenen Perspektiven.

